



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

# Construyendo hoy la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI



**COMUNA 13**

**METROCALI**

**Marzo 11 /2015**

# Avance de obra Terminal Calipso - Julio Rincón



## Avance de la Obra al 28 de Enero de 2015: 90%

ETAPA	FECHA
Pre-construcción	Marzo 17/2014
Construcción	Abril 16/2014
Finalización de la Obra	Febrero 25/2015
Entrega de la Obra	Primera semana de Marzo /2015

El avance de la obra se estima en un 90%  
El 10% restante se relaciona con la obra blanca:

- Estructuras Metálicas de la cubierta,
- Adecuación de baños
- Instalación de vidrios.

Costo ejecutado: \$9.426 millones

Adición presupuestal: \$3.074 millones

Costo total de la Obra: \$12.500 millones.

# Avance del carril Sur - Norte de la Troncal de Agua Blanca

Antes



Después



Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre/2014.

Metrocali informa que:

El carril sur norte y su espacio público (andenes, bahías paraderos) está terminado y en funcionamiento.

Los puentes peatonales están contruidos y en funcionamiento.

Está pendiente la entrega de toda la obra de adecuación vial por parte del contratista y la respectiva socialización que se le haga a la comunidad.



# Avance en el mantenimiento corredores Pretroncales 1 – Comuna 13

Metrocali S.A. adjudicó a la constructora MECO S.A., la adecuación funcional vial de las zonas por donde transitan los buses alimentadores del SITM – MIO en la comuna 13, incluyendo la rehabilitación vial de 4 tramos viales, los cuales ya se encuentran terminados y presentaron una inversión de \$1.045.191.593.

VIA	DURACION	INICIO	INTERVENCION	ESTADO
CALLE 70 ENTRE CARRERA 24 Y DIAGONAL 15	37 días	FEBRERO/2014	BACHEO	TERMINADO
CALLE 70 ENTRE CARRERA 39 Y CARRERA 29	18 días	MARZO/2014	BACHEO	TERMINADO
CALLE 70 ENTRE TRANSVERSAL 28 D Y DIAGONAL 15	32 días	ABRIL/2014	BACHEO	TERMINADO
CARRERA 23 ENTRE CARRERA 15 Y DIAGONAL 15	5 días	JULIO/2014	SELLO	TERMINADO

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre de 2014.

# Avance en el mantenimiento de los puntos de parada del SITM-MIO en la Comuna 13

Metrocali S.A. adjudicó a la constructora MECO S.A., la adecuación de 19 puntos de parada del SITM – MIO en la comuna 13 con una inversión de \$218.595.347

PUNTOS DE PARADA COMUNA 13					
N°	DIRECCIÓN	BARRIO	MOGADOR	BANCA	ESTADO
1	CL70 KR28E KR28D3 I 1	Calipso	NO	SI	TERMINADO
2	CL73 KR22 DG19 P 1	Charco Azul	NO	NO	TERMINADO
3	CL73 KR25T KR25S P 1	Charco Azul	SI	NO	TERMINADO
4	CL36 KR32A KR32 I 1	El Diamante	NO	SI	TERMINADO
5	CL72U KR28E6 KR28E5 I 1	El Poblado II	SI	NO	TERMINADO
6	KR27 CL72 CL71B P 1	El Pondaje	NO	NO	TERMINADO
7	KR27 CL71 71A I 1	El Pondaje	NO	NO	TERMINADO
8	KR39 CL44A2 CL46 I 1	El Vergel	NO	SI	TERMINADO
9	KR39 CL42A CL42 I 1	El Vergel	NO	NO	TERMINADO
10	CL70 KR26H KR26E I 1	Lleras Restrepo	NO	NO	TERMINADO
11	CL70 KR26M KR26H I 1	Lleras Restrepo II	NO	NO	TERMINADO
12	CL72U KR26L KR26J P 1	Los Lagos	SI	NO	TERMINADO
13	CL73 KR26M KR26N P 1	Los Lagos	NO	NO	TERMINADO
14	CL72U DG26G7 DG26G8 P 1	Marroquín III	NO	NO	TERMINADO
15	CL73 DG26G6 DG26G7 P 1	Marroquín III	NO	NO	TERMINADO
16	CL72U KR27 P 1	Rodrigo Lara Bonilla	NO	NO	TERMINADO
17	CL73 DG26C DG26C1 P 1	Sector Laguna del Pondaje	NO	NO	TERMINADO
18	CL70 KR26 KR25B I 1	Ulpiano Lloreda	NO	NO	TERMINADO
19	CL70 KR24C KR24 I 1	Ulpiano Lloreda	NO	SI	TERMINADO

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre de 2014.



# Avance de la construcción del paso peatonal del puente vehicular de la Cra. 28D con Calle 71B Canal Cañaveralejos II




Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Marzo de 2015.

Metro Cali informa que en agosto de 2014 ejecutaron las obras para la adecuación del paso peatonal del puente.

El puente se encuentra en uso por parte de la comunidad desde Septiembre de 2014.

# Avance en la solicitud del diseño de una ruta de buses alimentadores en sentido Norte – Sur 2

**Fig. 1. Rutas que operan en la Comuna 13**

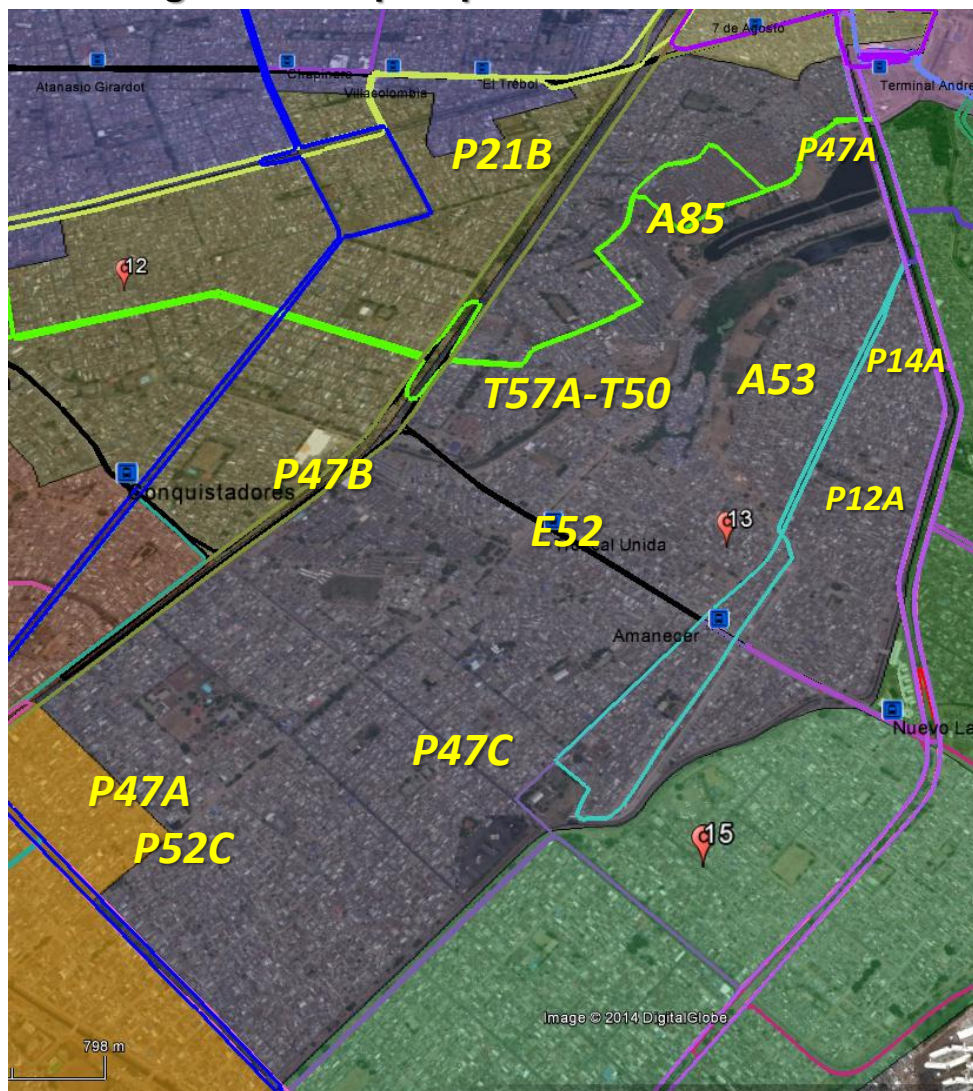

Metro Cali informa que:

No se ha realizado ningún avance positivo ante la implementación de rutas en la Comuna 13.

Los futuros cambios se encuentran programados en el PSO de Abril/2015 después de la puesta en funcionamiento de la estación intermedia Calipso - Julio Rincón.

La inserción o modificación de rutas se hará paulatinamente de acuerdo a los resultados de los PSO de febrero y marzo de 2015.

**Ruta del SITM-MIO que circulan en la comuna 13**

**Ruta Troncales y Expresas:** T57A-T50-E52

**Rutas Alimentadoras:** A85-A53

**Rutas Pretroncales:** P47A-P47B-P47C-P21B-P12A-P14A(R) (Ver Figura 1).
