



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

# Construyendo hoy la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI



## ALCALDÍA EN TU COMUNA COMUNA 13

# INFRAESTRUCTURA

**MARZO 11 DE 2015**

# Anuncio pavimentación de la Calle 42 con Carrera 31A y 50



Calle 42 con Carrera 34  
El Vergel  
Fuente: Google Maps

- La S.I.V, con una inversión de \$9.600 millones de recursos propios, realizará la pavimentación de 4.4 kilómetros (30.800 mts<sup>2</sup>) de vía en el tramo comprendido entre la Calle 42 con Carrera 31 a y 50, vía que tendrá 7 metros de ancho.
- Se espera dar inicio al proceso licitatorio a partir del 7 de abril/2015.
- El tramo a intervenir beneficiará a la Comuna 13 entre la Calle 42 con Carrera 31A y 39, y a la Comuna 16 entre la Calle 42 con Carrera 39 a 50.

# Sobre la pavimentación de la Carrera 26H con Diagonal 70



Foto: Carrera 26H con Diagonal 70  
Lleras Restrepo

La Secretaria de infraestructura y Valorización informó en el evento de la Alcaldía en Tu Comuna – Comuna 13, que el proyecto de desembotellamiento de la Carrera 26H con Diagonal 70 presenta los siguientes avances:

- Se tiene estudio topográfico
- Esquema básico vial, elaborado por la S.I.V. y aprobado por el Departamento Municipal de Planeación.
- Avalúo de predios
- Notificación a propietarios de los predios de parte de la oficina jurídica de Planeación y la S.I.V

Se espera que al finalizar el año se tenga los procesos pre-contractuales para realizar la pavimentación y así subsanar del desembotellamiento que se presenta en la zona.





## Obras de Pavimentación y Mantenimiento ejecutadas 2012-2014

**Con una inversión por recursos propios de \$ 1.087 millones, la S.I.V. ejecutó seis (6) obras de pavimentación (\$ 405 millones) y diez (10) obras de mantenimiento (\$ 682 millones) en (9) barrios en la comuna 13, entre el año 2012 y 2014**



# Balance obras de pavimentación ejecutadas

La Secretaría de Infraestructura y Valorización realizó entre el año 2012 y 2014 seis (6) obras de pavimentación en seis (6) barrios de la comuna 13. Se intervino un área aproximada de 2.211 Mts2, con una inversión de aproximadamente \$405 millones de recursos propios de la dependencia.



Barrio: El Vergel - Carrera 44 entre Calles 37 y 39

Fuente: S.I.V.

Vigencia	No. Intervenciones	Barrios	Área aproximada (M2)	Inversión
2012	1	Lara Bonilla	320	\$ 48.256.312
2013	1	Nuevo Horizonte II	625	\$ 132.663.086
2014	4	Comuneros II, El Vergel, Los Lagos y Omar Torrijos.	1266	\$ 224.346.831
Total	6	Seis (6) barrios	<b>2211</b>	<b>\$ 405.266.229</b>

Fuente: S.I.V.

# Obras de pavimentación ejecutadas

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, en relación a las vías solicitadas para obras de pavimentación con recursos propios, informa que:

## Obras de pavimentación ejecutadas - Recursos propios - Comuna 13

Vigencia	Dirección	Barrio	Fecha inicio obra	Fecha finalización obra	Contratista	Área aproximada (M2)	Inversión
2012	Carrera 27 entre Calles 72T y 72S Bis	Lara Bonilla	03 de diciembre de 2012	26 de diciembre de 2012	Construimos Ingeniería	320	\$ 48.256.312
2013	Calle 72F4 entre Carrera 28E BIS y 28E 1	Nuevo Horizonte II	12 de agosto de 2013	23 de diciembre de 2013	William Hurtado	625	\$ 132.663.086
2014	Calle 44 A entre Carreras 37 y 39	El Vergel	10 de noviembre de 2014	Semana del 17 al 23 de Enero de 2015	Álvaro Lázaro del Valle	190	\$ 43.903.001
2014	Carrera 27G entre Calles 72W2 y 72W	Omar Torrijos	11 de noviembre de 2014	Semana del 17 al 23 de Enero de 2015	Álvaro Lázaro del Valle	154	\$ 42. 944.940
2014	Calle 72W entre Carreras 26M y 26I3	Los Lagos	12 de noviembre de 2014	Semana del 17 al 23 de enero de 2015	Álvaro Lázaro del Valle	790	\$ 139.141.446
2014	Carrera 28A entre Calles 72M y 72N (Carrera 33C entre calles 44 y 44A)	Comuneros II	14 de noviembre de 2014	28 de enero de 2015	Daniel Vélez Parra	132	\$41.302.384
<b>Total</b>						<b>2.211</b>	<b>\$ 405.266.229</b>

Fuente: S.I.V.



Barrio: El Vergel -  
Carrera 44  
entre Calles 37  
y 39

Fuente: SIV



# Balance obras de mantenimiento ejecutadas

La Secretaría de Infraestructura y Valorización realizó entre el año 2012 y 2014 diez (10) obras de mantenimiento en cinco (5) barrios de la comuna 13. Se intervino un área aproximada de 5908 Mts2, con una inversión de aproximadamente \$682 millones de recursos propios de la dependencia. La inversión mas representativa se realizó en el año 2013, con \$442 millones y siete (7) intervenciones.

Vigencia	No. Intervenciones	Barrios	Área aproximada	Inversión
2012	1	El Poblado I	40	\$ 48.571.533
2013	7	El Diamante, El Vergel, El Poblado I y Omar Torrijos	4474	\$ 442.177.098
2014	2	El Poblado I y II	1394	\$ 191.635.776
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>Cinco (5) barrios</b>	<b>5908</b>	<b>\$ 682.384.407</b>

Fuente: S.I.V.

En total, la S.I.V. a invertido \$ 1.087.650.636 de recursos propios para realizar dieciséis (16) intervenciones entre pavimentación y mantenimiento en nueve (9) barrios de la comuna 13.



# Obras de mantenimiento ejecutadas

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, en relación a las vías solicitadas para obras de mantenimiento con recursos propios, informa que:

Vigencia	Dirección	Barrio	Fecha inicio obra	Fecha finalización obra	Contratista	Área aproximada (M2)	Inversión
2012	Carrera 28F con Calle 72Y – Puente peatonal	El Poblado I	29 de noviembre de 2012	Diciembre 29 de 2012	Gustavo Alberto Martínez Cruz	40	\$ 48.571.533
2013	Carrera 33 entre Calles 36 y 38; Carrera 33, 38 y 39	El Diamante	28 de agosto de 2013	18 de diciembre de 2013	Harold Alberto Muñoz	1020	\$ 60.741.050
2013	Carrera 33 entre Calles 42 y 44	El Vergel	24 de diciembre de 2013	21 de abril de 2014	Unión Temporal Edificar 19-2013	1839	\$ 174.366.810
2013	Carrera 33B Entre Calles 38 y 42	El Diamante	26 de noviembre de 2013	14 de julio de 2014	Consorcio Mantenival 2013-Denis Edgardo Romero Jiménez	162	\$ 22.571.645
2013	Carrera 33A entre Calles 38 y 42	El Diamante	26 de noviembre de 2013	14 de julio de 2014		345	\$ 46.778.203
2013	Carrera 30A entre Calles 40 y 41	El Diamante	26 de noviembre de 2013	14 de julio de 2014		253	\$ 35.491.444
2013	Calle 46 entre Carrera 30 y 31	El Poblado I	26 de noviembre de 2013	14 de julio de 2014		505	\$ 50.673.817
2013	Carrera 27G entre Calles 72Y y 72W2	Omar Torrijos	26 de noviembre de 2013	15 de agosto de 2014		350	\$ 51.554.129
2014	Carrera 28A1 entre Calles 72W y 72U	El Poblado II	29 de abril de 2014	9 de diciembre de 2014	Álvaro Hernán Hormaza Sarria	246	\$ 52.451.106
2014	Calle 72T entre Carrera 29 y 28F	El Poblado I	10 de noviembre de 2014	19 de enero de 2015	Consorcio Mantenimiento Vías Cali 2014 -Gabriel Alonso Urrea Valdés	1148	\$ 139.184.670
<b>Total</b>		<b>Cinco (5) barrios</b>				<b>5908</b>	<b>\$ 682.384.407</b>

Fuente: S.I.V.

Dentro de las obras anteriores, con una inversión de \$48.5 millones de recursos propios, se incluye el mantenimiento de un puente peatonal ubicado en la Carrera 28F con Calle 72Y, en el barrio El Poblado I.



Foto: Carrera 28D2 entre Calles 72F4 y 72I  
Los Comuneros II

## **Obras de Pavimentación y Mantenimiento en ejecución 2014-2015**

**Con una inversión de \$169 millones de recursos propios, la S.I.V. se encuentra ejecutando actualmente tres (3) obras de pavimentación en los barrios Lara Bonilla- Sector La Paz y Los Comuneros II, permitiendo tener 889 Mts<sup>2</sup> de vías nuevas en la comuna 13.**

# Obras de pavimentación y mantenimiento en ejecución

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, actualmente se encuentra ejecutando tres (3) pavimentaciones en el barrio Lara Bonilla – Sector La Paz, Los Comuneros II, con una inversión de \$169 millones de recursos propios de la dependencia – vigencia 2014. Se espera pavimentar 889 Mts2 de vía.

Vigencia	Tipo	Dirección	Barrio	Estado	Fecha inicio obra	Fecha proyectada de finalización obra	Contratista	Área aproximada (M2)	Inversión
2014	Pavimentación	Carrera 28D2 entre Calles 72F4 y 72I	Los Comuneros II	En sub base - lista para programar fundición	7 de enero de 2015	Principios de marzo de 2015	Entre Obras SAS Alexander Suarez Rodríguez 4151.0.26.1.62 3.2014 , Entre Obras SAS	323	\$ 53.687.214
2014	Pavimentación	Calle 72S1 entre Carrera 27A y Transversal 72W	Lara Bonilla Sector La Paz	Con acta de inicio-	7 de enero de 2015	Finales de marzo de 2015		234	\$ 47.306.727
2014	Pavimentación	Carrera 27A entre Calle 72U y 72T	Lara Bonilla Sector La Paz	Con acta de inicio-	7 de enero de 2015	Finales de marzo de 2015		332	\$ 68.077.491
<b>Total</b>								<b>889</b>	<b>\$ 169.071.432</b>

Fuente: S.I.V.





Foto: Calle 72W entre Carreras 26I3 y 26H1  
Barrio Los Lagos I



Construyendo hoy  
la **Cali** del mañana  
ALCALDÍA DE CALI




## Obras de Pavimentación, Rehabilitación y Mantenimiento en proceso de licitación 2014-2015

**La S.I.V., con una inversión de \$212 millones mediante la estrategia TIO, tiene en proceso de licitación una (1) obra de pavimentación en la comuna 13, en el barrio Los Lagos I, esperando pavimentar 373 Mts2 de vía.**

# Obras de pavimentación Calle 72W entre Carreras 26I3 y 26H1

Con una inversión de \$212 millones de recursos propios, la Secretaría de Infraestructura y Valorización, tiene en proceso de licitación una (1) obra de pavimentación en el barrio Los Lagos I, esperando tener 373 Mts2 de vías nuevas. Esta obra se realizará mediante la estrategia TIO.

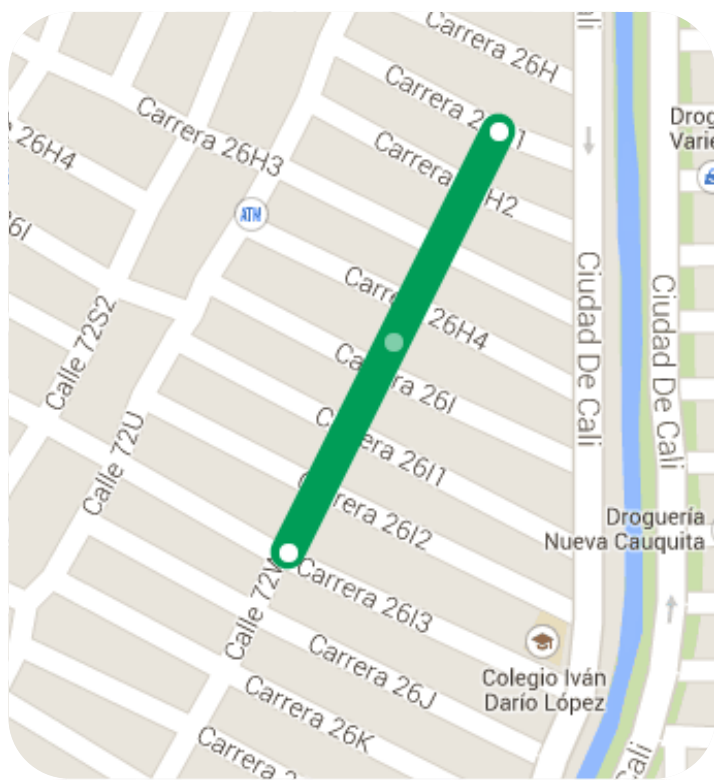

Fuente: Google Maps

Vigencia	Dirección	Barrio	Estado	Área aproximada (M2)	Inversión
2014	Calle 72W entre Carreras 26I3 y 26H1	Los Lagos I	En proceso licitatorio - Mediante la estrategia TIO - 4151.SA.28.2014	373	\$ 212.872.730

Fuente: SIV



Fuente: Google Maps





Foto: CII 72U DG. 26G8 Marroquín III  
Fuente: S.I.V.

### **Obras de Bacheo 2013 - 2014**

**\$ 449 millones es la inversión realizada por la Secretaría de Infraestructura en obras de bacheo en ocho (8) barrios de la comuna 13, entre el año 2013 y 2014, permitiendo recuperar 8.985 Mts<sup>2</sup> de vía en 37 tramos viales y 101 intervenciones.**



# Información sobre obras de Bacheo realizados en el 2013 y 2014

La Secretaría de Infraestructura y Valorización durante los años **2013 y 2014**, con una inversión total aproximada de **\$449.257.500**, ha efectuado en ocho (8) barrios **101 intervenciones de bacheo**, en **37 tramos**, que han permitido recuperar **8.985 Mts2** de vías.



Calle 72U DG 26G8 – Marroquín III

Fuente: SIV

Obras de bacheo realizadas en la Comuna 13 - Año 2013-2014			
Barrio	Área (Mts2)	No. Intervenciones de Bacheo	Tramos
Calipso	1147,64	15	3
El Laguito	100	1	1
El Poblado I	1271,13	22	7
Los Lagos	1097,95	11	5
Los Robles	1389,75	14	5
Marroquin III	2739,17	25	9
Ulpiano Lloreda	334,3	1	1
Villa del Lago	905,21	12	6
<b>Total</b>	<b>8985,15</b>	<b>101</b>	<b>37</b>

Fuente: Grupo Operativo S.I.V

En el año 2013, la S.I.V. realizó 48 intervenciones de bacheo, recuperando 3.566 Mts2 de vía, con una inversión de \$ 178.304.500. Para el año 2014, se realizaron 53 intervenciones, recuperando 5.419 Mts2 de vía, con una inversión aproximada de \$ 270.953.000.

## Avance sobre obras de bacheo solicitadas por la comunidad

Dirección	Barrio	Estado	Área (M2)	Fecha realización
Calle 72F con transversal 28E - Frente a la Iglesia y la Sede Comunal.	Calipso Sector III	Ejecutada	242,14	1, 2 y 3 de Julio de 2014
Calle 72F4 y 72F5 con Cra 28D3 - (Bahía de parqueo en el sector).	Calipso Sector III	Ejecutada	694	7, 8 y 9 de Julio de 2014
Calle 72H con carrera 28D3 - (Utilizada para desvío vial de la troncal de Agua Blanca )	Calipso Sector III	Ejecutada	211,5	1, 2 y 3 de Julio de 2014
Transversal 28F entre Calle 72I y Cra. 28D	Los Robles	Falta un tramo por ejecutar	Pendiente	Pendiente
Carrera 27 entre calle 70 y 71	El Pondaje	Ejecutada por Metrocali		
Calle 72P entre Carrera 28D5 y 28D4 - Donde se Ubica la I.E Luz Haydee Guerrero Molina	Los Robles	Por programar	Pendiente	Pendiente
Calle 72L1 y 72L2 con Cra 28F	Los Robles	Por programar	Pendiente	Pendiente
Diagonal 71 y 72B con Carrera 26L	Ricardo Balcázar	Se realizará el mantenimiento de la Carrera 26l entre Diagonal 70 y 72 , con recursos del Situado Fiscal	Pendiente	Pendiente

Fuente: S.I.V.


De los bacheos solicitados por la comunidad, la Secretaría de Infraestructura y Valorización ha realizado tres (3) intervenciones en el mes de julio de 2014, permitiendo recuperar 1147 Mts2 de vías en el barrio Calipso Sector III. Metrocali, por su parte, ejecutó el bacheo de la Carrera 27 entre Calles 70 y 71. En la Carrera 26l entre Diagonal 70 y 72, se realizará mantenimiento por medio de Situado Fiscal en el año 2015. En la Transversal 28F entre Calle 72I y Cra 28D, falta un tramo por ejecutar.

Respecto a dos (2) obras de bacheo en el barrio Los Robles, aun se espera programación para ser intervenida durante el año 2015.

## Obras de bacheo programadas

La Secretaría de Infraestructura y Valorización realizará entre el mes de febrero y marzo de 2015, tres (3) obras de bacheo en el barrio Charco Azul y Villa del Lago en las siguientes direcciones:

- Diagonal 71 A 1 entre Carrera 24 y Calle 73 - Charco Azul - **Punto rojo**
- Diagonal 71 A 1 entre Carreras 24 y 26 - Villa del Lago - **Línea verde**
- Diagonal 70 entre Carreras 26 S y 26 H - Villa del Lago – **Línea azul**

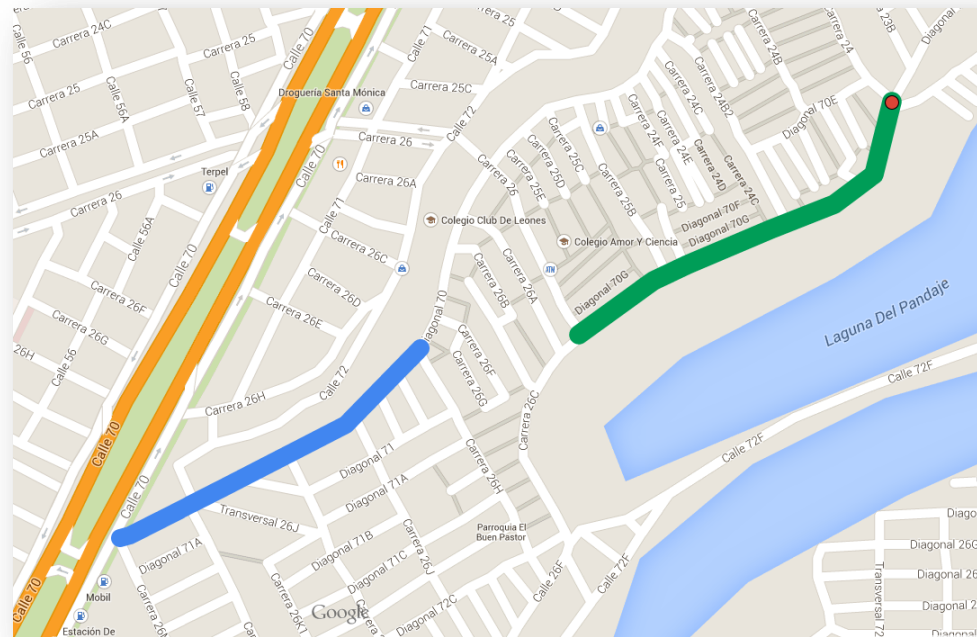

Fuente: Google Maps





## Obra para ser ejecutada

Foto: Calle 71l entre Carrera 28  
Los Comuneros II

### Obras de Pavimentación por ejecutar e información sobre otras obras

**Entre la Estrategia de Inclusión y Oportunidades - TIO, la Secretaria de Infraestructura y Valorización y EMCALI, se encuentran realizando las gestiones para la incluir tres (3) obras de pavimentación en el barrio los Comuneros II con una inversión de \$1.277 millones, en la Calle 72l entre Carrera 28ª, 28D, 28D3 y 28E.**

# Obras de pavimentación Calle 72l entre Carreras 28A, 28D, 28D3 y 28E

Respeto a tres (3) obras de pavimentación solicitadas por la comunidad, la Secretaría de Infraestructura y Valorización informa que:

Obras de pavimentación - Mediante el programa TIO			
Dirección	Barrio	Inversión	Observacion
Calle 72l entre Carrera 28D3 y la carrera 28D sur-norte	Los Comuneros II	\$ 397.233.000	La estrategia TIO, la Secretaria de Infraestructura y EMCALI, se encuentran realizando las gestiones para la incluir la reubicación de redes de acueducto sobre estos tramos.
Calle 72l entre Carrera 28D y Transversal 28E	Los Comuneros II	\$ 593.009.000	
Calle 72l entre Cra 28D y 28 A	Los Comuneros II	\$287.479.832	
Total		\$1.277.721.832	



Calle 72l con Carrera 28<sup>a</sup>  
Los Comuneros II

Fuente: S.I.V.


Mediante la estrategia TIO, con una inversión de 1.277 millones de vigencia 2015, se está realizando la gestión necesaria para llevar a cabo la pavimentación de estos tres tramos en el barrio Los Comuneros II, de la comuna 13.

# Sobre la pavimentación de la Carrera 22A entre Calles 72B y 73



Foto: Carrera 22A entre Calles 72B y 73  
Ulpiano Lloreda

La obra planteada en la Carrera 22 A entre Calles 72B y 73 – barrio Ulpiano Lloreda (considerada dentro de las solicitudes de la comunidad y la estrategia TIO), no se ha viabilizado técnicamente debido a que no se ha podido establecer la calidad del bien de la vía solicitada (escrituras).

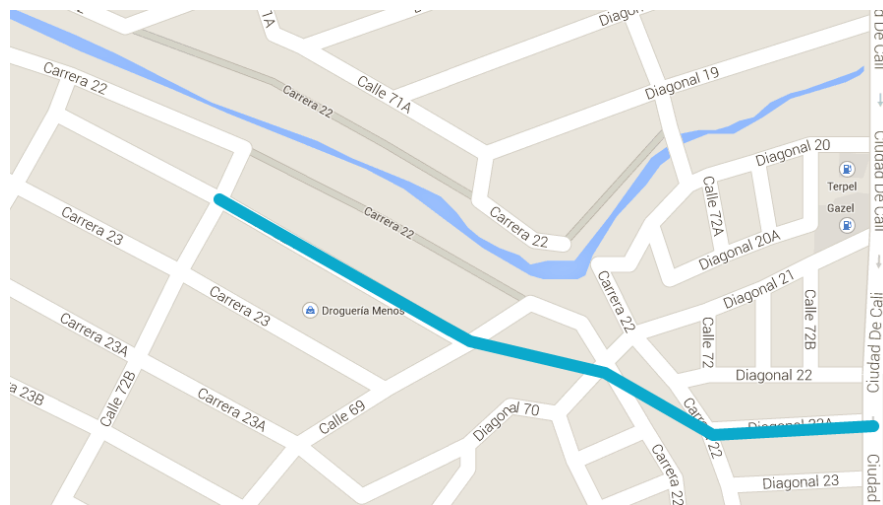

Fuente: Google Maps



# Sobre la pavimentación de la Carrera 26H con Diagonal 70



Foto: Carrera 26H con Diagonal 70  
Lleras Restrepo

La Secretaria de infraestructura y Valorización informa que el proyecto de desembotellamiento de la carrera 26h con diagonal 70, se encuentra en consecución de estudios previos correspondientes para este tipo de proyecto como son:

- Diseño y levantamiento topográfico existente
- Conceptos y de estado de funcionamiento de la red de acueducto y alcantarillado
- Diseño de la nueva red de acueducto y alcantarillado
- Estudio de suelos
- Diseño de pavimentos
- Actualización de esquema vial
- Aprobación de primer planteamiento geométrico y diseño
- Calidad del bien
- Recopilación de escrituras del barrio y de las vías afectar

Por último, procede adelantar el tramite pertinente adquisición de predios; por lo tanto, una vez el proyecto cumpla con los documentos en mención se podrá hacer acercamiento a los diferentes propietarios y de esta manera socializar dicha intervención



# Otras obras de pavimentación

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, informa que:

Obras de pavimentación que su viabilidad estaba sujeta a intervenciones por parte de EMCALI		
Dirección	Barrio	Observacion
Calle 42 entre Carreras 31 y 39	El Vergel	La Secretaria incluyo en el presupuesto de la vigencia 2015 la ejecución de la vía Calle 42 entre la carrera 31 y carrera 50. Se esta adelantando con EMCALI, la intervención de redes para su pronta ejecución.
Carrera 28D3 entre Calle 70 y Calle 72I - La calzada faltante	Calipso	EMCALI realizó el traslado de las redes necesarias en el mes de septiembre de 2014, no alcanzando a ser incluida en el presupuesto de la vigencia 2015, debido a que fue entregado en Junio del 2014.

Obras de pavimentación pendientes de viabilidad presupuestal		
Dirección	Barrio	Observacion
Carrera 28E entre Cille 70 hasta la 72C	Calipso - el Diamante	Se está recopilando los estudios previos requeridos; una vez se cuente con viabilidad técnica, se priorizara en la medida que se disponga de recurso presupuestal.
Transversal 28E entre Cille 72C hasta la 72I	El Diamante	
Carrera 28C entre Calle 71B a 72 A	El Pondaje	Cuentan con estudios técnicos, mas no viabilidad presupuestal. Una vez se tengan los recursos, se realizará el proceso de priorización.
Diagonal 72F entre Carreras 27 y 28Bis	Sector Laguna del Pondaje	

La S.I.V. realizará la pavimentación de la vía de la Calle 42 entre Cra 31 y 50, con la intervención de redes por parte de Emcali, presupuesto incluido en la vigencia 2015.



Foto: Calle 72l entre Transversal, 28F y Carrera  
28F - Separador vial  
Barrio Nuevo Horizonte

**Balance de inversión 2012-2014 y  
proyectos a realizar en el 2015 por parte de la S.I.V.**

# Balance de inversión realizado por la S.I.V. en la Comuna 13 con recursos propios vigencias 2012, 2013 y 2014

Vigencia/Estado obra	No. Intervenciones de pavimentación	No. intervenciones mantenimiento	No. De intervenciones de bacheo	Barrios	Área aproximada	Inversión
2012	1	1		Lara Bonilla, El Poblado I	360	\$ 96.827.845
2013	1	7	48	Nuevo Horizonte II, El Diamante, El Vergel, El Poblado I y Omar Torrijos, Villa del Lago, Los Robles.	8.665	\$ 753.144.684
2014	4	2	53	Comuneros II, El Vergel, Los Lagos y Omar Torrijos, El Poblado I y II, El Laguito, Calipso, Ulpiano Lloreda, Marroquín III.	8.079	\$ 686.935.607
<i>Total obras ejecutadas 2012-2014</i>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>101</b>	<b>Quince (15) barrios</b>	<b>17.104</b>	<b>\$ 1.536.908.136</b>
<i>Obras en ejecución 2014-2015 - recursos vigencia 2014</i>	<b>3</b>			Lara Bonilla	889	<b>\$ 169.071.432</b>
<i>Obras en proceso de licitación 2014-2015 - recursos vigencia 2014</i>	1			Los Lagos I	373	\$ 212.872.730
<i>Total obras realizadas y por realizar con recursos propios vigencia 2012-2014</i>	16	10	101	<b>Quince (15) barrios</b>	<b>18.366</b>	<b>\$ 1.918.852.298</b>

Fuente: S.I.V.

Los recursos propios invertidos vigencia 2012-2014 (incluyendo obras ejecutadas, en proceso de ejecución, en licitación y por ejecutar) serían aproximadamente \$ 1.918 millones.

## Obras a realizar en el año 2015– Comuna 13

### Recursos propios

Para el año 2015, la S.I.V. realizará una (1) obra (dividido en tres tramos) de pavimentación, tres (3) obras de rehabilitación de andenes y una (1) rehabilitación vial en los barrios Nuevo Los Comuneros II, El Vergel y Nuevo Horizonte, en la Comuna 13, con una inversión aproximada de \$1.575 millones de recursos propios de la dependencia.

Obras proyectadas para el año 2015 con recursos propios - Comuna 13			
Tipo de obra	Dirección	Barrio	Valor
Pavimentación	Obras de pavimentación Calle 72I entre Carreras 28A, 28D, 28D3 y 28E	Los Comuneros II	\$1.277.721.832
Rehabilitación Anden	Calle 72I entre Transversal, 28F y Carrera 28F - Separador vial	Nuevo Horizonte	\$ 6.446.571
Rehabilitación Anden	Carrera 28D3 entre Calles 72H y 72J - Cancha de futbol	Los Comuneros II	\$ 15.250.455
Rehabilitación Anden	Calle 72I entre Trans, 28F y Carrera 28E - Separador vial	Nuevo Horizonte	\$ 8.696.928
Rehabilitación vial	Carrera 33 entre Calles 44 y 48	El Vergel	\$ 267.004.590
<b>Total</b>		<b>Tres (3) barrios</b>	<b>\$ 1.575.120.376</b>

Fuente: S.I.V.



## Inversión realizada de la S.I.V. entre el 2012-2015

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, entre el periodo 2012-2015, habrá invertido cerca de \$3.493 millones de recursos propios de la dependencia en quince (15) barrios de la comuna 13.

Estado obras/proyectos	Inversión
<i>Obras ejecutadas 2012-2014</i>	<b>\$ 1.536.908.136</b>
<i>Obras en ejecución 2014-2015 - recursos vigencia 2014</i>	\$ 169.071.432
<i>Obras en proceso de licitación 2014-2015 - recursos vigencia 2014</i>	\$ 212.872.730
<i>Obras por ejecutar con recursos vigencia 2015</i>	\$ 1.575.120.376
<b><i>Total inversión recursos propios 2012-2015</i></b>	<b>\$ 3.493.972.674</b>

Fuente: S.I.V

## Obras a realizar en el año 2015– Comuna 13

### Situado Fiscal

Para el año 2015, la S.I.V. realizará cinco (5) obras de mantenimiento en los barrios Nuevo Los Comuneros II, El Diamante, El Poblado I, Ricardo Balcázar y Yira Castro, con una inversión aproximada de \$326.650.089 de recursos del situado fiscal.

Vigencia	Tipo	Dirección	Barrio	Inversión
2015	Mantenimiento	Calle 72H entre Carrera 283 y 28B	Comuneros II	\$ 38.306.372
2015	Mantenimiento	Carrera 33 entre Calles 39 y 41	El Diamante	\$ 79.555.730
2015	Mantenimiento	Calle 46 entre Carreras 29A y 30	El Poblado I	\$ 28.349.625
2015	Mantenimiento	Diagonal 28D3 entre transversal 72F y carrera 28D3	Yira Castro	\$ 76.996.676
2015	Mantenimiento	Carrera 26L entre diagonal 70 y 72A	Ricardo Balcazar	\$ 103.441.686
<b>Total</b>			<b>Cinco (5) barrios</b>	<b>\$ 326.650.089</b>

Fuente: S.I.V.
