



INVERSIONES DESTACADAS COMUNA 13

3ER. SEGUIMIENTO
Septiembre 16/2014

PLAN JARILLON



Avance en el Plan de reubicación de asentamientos laguna El Pondaje y Charco Azul – Comuna 13

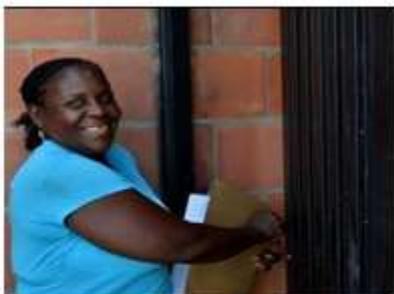


Foto: beneficiaria recibiendo su vivienda en Potrero Grande. Fuente: Secretaría de Vivienda.



Foto: beneficiaria VIP en Urb. Llano Verde. Fuente: Secretaría de Vivienda.

La Secretaría de Vivienda informa:

A julio 31/2014 se han entregado 1.062 VIP bajo el proyecto del Plan Jarillón, de las cuales 384 viviendas pertenecen a Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto localizados en la Comuna 13 en la laguna del Pondaje que fueron reasentados en los proyectos habitacionales de Llano Verde (comuna 15) y Potrero Grande (Comuna 21), relacionados con el Plan de reubicación de asentamientos, así:

Asentamiento	Ubicación Inicial AHD	Sitio reasentamiento	Total	#familias reasentadas y fecha
Nueva Ilusion	Pondaje	Urb. Llano Verde	134	(119) Abril/2014 (15) Mayo/2014.
Villa Uribe	Pondaje	Urb. Llano Verde	19	(17) Abril/2014 (2) Mayo/2014
Brisas de la Paz	Pondaje	Urb. Llano Verde	117	(15) Abril/2014 (102) Mayo/2014.
Sardi	Pondaje	Potrero Grande	36	(17) Abril/2014 (19) Mayo/2014
Sardi	Pondaje	Urb. Llano Verde	78	(20) Abril/2014 (58) Mayo/2014
TOTAL VIVIENDAS ENTREGADAS			384	


Mapa de AHDI – Laguna Pondaje y Charco Azul



EMCALI



Intervención de limpieza y entamboramiento del canal Cañaveralejo II

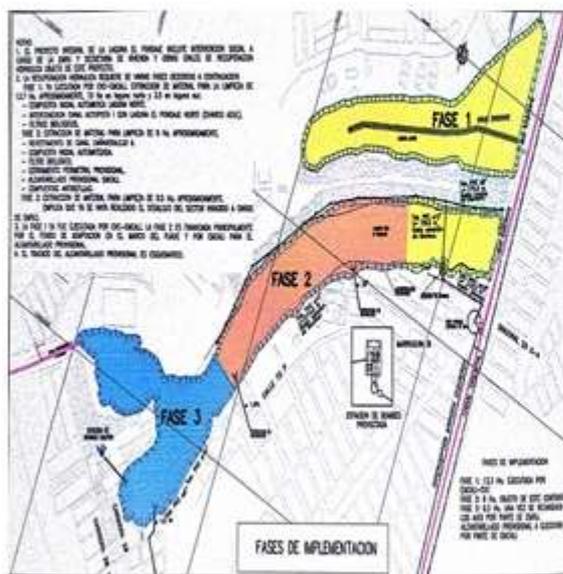

EMCALI informa que a través Fondo Adaptación (FDA) - Proyecto Jarillón de Aguablanca y obras complementarias- PJAOC se culminará la recuperación de la Laguna el Pondaje – Charco Azul, de la comuna 13, en tres (3) fases así:

FASE I (Ejecutada 2011-2012 CVC – EMCALI con recursos propios) Limpieza de sedimentos en 13,5 hectáreas (Ha) así:

- 10 Ha (Zona Norte – Charco Azul)
- 3,5Ha (zona sur)
- Instalación de compuerta radial automática (zona norte)
- Interconexión canal autopista 1 con laguna Pondaje (zona norte) y filtros biológicos.

FASE II (\$22,162 millones Contratados en Agosto 2014, por el FDA - PJAOC) para:

- Limpieza sedimento de 8 Ha, revestimiento de 575m lineales del último tramo del canal de aguas lluvias Cañaveralejo II, entre la Autopista Oriental y la Laguna del Pondaje zona sur.
- Instalación de compuerta radial automatizada, filtro biológico, cerramiento perimetral provisional y alcantarillado perimetral y compuertas antirreflejo.

FASE III (Pendiente a financiar por el FDA – PJAOC) para: Limpieza de sedimento en 9,5 Ha donde actualmente están los últimos asentamientos subnormales a relocalizar por el PJAOC.



Construyendo hoy
la **Cali** del mañana


ALCALDÍA DE CALI

VIVIENDA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance a titulación de predios

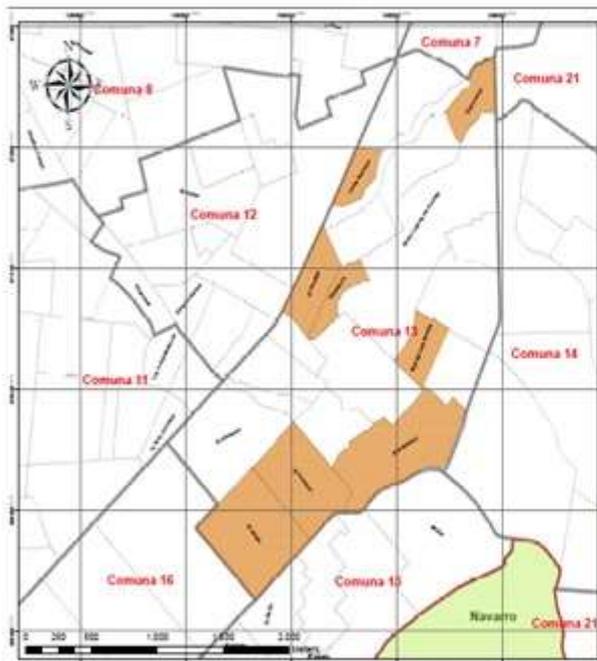

Fuente: Secretaría de Vivienda. Barrios Comuna 13 con posibilidad de titular.

La Secretaría de Vivienda informa que :

Entre el 2013 y Septiembre/2014, se han **titulado 262 predios** en la comuna 13 así:

- ✓ **Vergel:** 93 predios
- ✓ **Poblado II:** 78 predios
- ✓ **Poblado I:** 34 predios
- ✓ **Villa Blanca:** 28 predios
- ✓ **Charco Azul:** 21 predios
- ✓ **Lleras Restrepo:** 5 predios
- ✓ **Rodrigo Lara Bonilla:** 2 predios
- ✓ **El Pondaje:** 1 predio.

El 9 de octubre/2013 se realizó en la Caseta del Pondaje, un taller para explicar la resolución No. 010 de 1997 donde se informó el Procedimiento y requisitos para efectuar titulación en 8 barrios que fueron promovidos por la S.V.S en la comuna 13: Lleras Restrepo, El Vergel, Poblado I y II, Rodrigo Lara Bonilla, Charco Azul, Villa Blanca y El Pondaje.

Avance a subsidios de mejoramiento de vivienda



Fuente: Secretaría de Vivienda.



Fuente: Secretaría de Vivienda.

La Secretaría de Vivienda informa que entre el 2013 y el 2014 se han asignado un total de \$953 Millones para 193 subsidios de mejoramiento de vivienda en la comuna 13, previo cumplimiento de los requisitos como lo establece el Acuerdo 049 de 1999.

Vigencia	No. Resolución	No. Familias	Observación
2013	Res.395/2013 y Res.413/2013	81	Ejecutados en 2013 y Junio/2014 en los Barrios: Vergel (53), Poblado I (7) y Poblado II (21).
2014	Res.253 Abril 23/2014	21	Tiene contratista asignado. Se inició proceso de socialización a la comunidad para iniciar obras.
2014	Res.371 Junio 16/2014	25	Tiene contratista asignado. Se inició proceso de socialización a la comunidad para iniciar obras.
2014	Res.485 Agosto 13/2014	27	En proceso de notificación y posteriormente se iniciará proceso de licitación.
2014	Res.511 Agosto 25/2014	32	En proceso de notificación y posteriormente se iniciará proceso de licitación.
Total 2013- 2014		186	\$953 Millones

Los términos de ejecución son de 120 días, a partir del inicio de la obra.

El subsidio aplica únicamente para barrios desarrollados por la Secretaría de Vivienda y el Fondo Especial de Vivienda, su monto máximo es de \$5 millones, cubriendo hasta agotar recursos las siguientes opciones de obras: Adecuación de cocinas, baños y techos



INFRAESTRUCTURA



Obras de Mantenimiento Ejecutadas con Recursos Sobretasa 2013



Foto: Cra 30 A entre Calles 40 y 41 Fuente Mantenimiento Vial



Foto: Carrera 27G entre Calles 72Y Y 72W2-Fuente: Mantenimiento Vial

La Secretaría de Infraestructura y Valorización con una inversión de \$559 millones de Sobretasa a la Gasolina/2013, ejecutó ocho (8) obras de Mantenimiento vial en cinco (5) barrios de la Comuna 13.

Dos de las obras fueron entregadas a la comunidad y las otras seis están pendiente de ser recibidas por parte de la S.I.V y hacer la entrega oficial.

OBRA	BARRIO	Vr. OBRA \$	CONTRATISTA	Clase	OB SERV.
Carrera 33 entre Calles 42 Y 44	El Vergel	159.187.798	Unión Temporal Edificar 19-2013 Andrés Fernando Rosero Vergara	Flexible	Liquidada y entregada a la Comunidad
Calle 46 entre Cras30 y 31	Poblado I	50.673.817	Consorcio MantenVial 2013 Denis Edgardo Romero Jiménez	Flexible	Ejecutada 15 agosto/2014, con acta de recibo
Calle72F-4 entre Cras 28E Bis y 28E-1	Sector Asprosocial	132.663.086	William Hurtado	Rígido	Obra entregada a la comunidad - liquidada
Carrera 27G entre Calles 72Y y 72W2	Omar Torrijos	51.554.129	Consorcio MantenVial 2013 Denis Edgardo Romero Jiménez	Rígido	Ejecutada 15 agosto/2014, con acta de recibo
Carrera 30A entre Calles 40 y 41	El Diamante	35.491.444	Consorcio MantenVial 2013 Denis Edgardo Romero Jiménez	Rígido	Ejecutada 15 agosto/2014, con acta de recibo
Carrera 33 entre Calles 36 y 38 Carrera 33,38 Y 39(Tramo comprendido entre la Placa No.38-82 y la Calle39)	El Diamante	60.741.050	Harold Alberto Muñoz	Flexible	Ejecutada y Entregada a la comunidad
Carrera 33A entre Calles 38 y 42	El Diamante	46.778.203	Consorcio MantenVial 2013 Denis Edgardo Romero Jiménez	Rígido	Ejecutada 15 agosto/2014, con acta de recibo
Carrera 33B entre Calles 38 y 42	El Diamante	22.571.645	Consorcio MantenVial 2013 Denis Edgardo Romero Jiménez	Rígido	Ejecutada 15 agosto/2014 con acta de recibo
		559.661.173			



Obras de Recursos Propios 2013 Adjudicadas



Antes : Cra 27G entre Calles 72W2



Después : Cra 27G entre Calles 72W2

La Secretaría de Infraestructura y Valorización informa que se adjudicaron:

\$281 millones de recursos propios del 2013 para cuatro (4) obras en igual número de barrios de las cuales:

(1) Obra de mantenimiento se ejecutó en julio de 2014 y tres obras de pavimento nuevo están pendientes por iniciar su ejecución así:

OBRA	BARRIO	TIPO DE OBRA	CONTRATISTA	VALOR DE LA OBRA	SUPERVISOR	FECHA INICIO	FECHA TERMIN	OBSERVACION
Carrera 28A1 entre Calles 72W y 72U	Poblado II	Mantenimiento	Álvaro Hernán Hormaza Sarria	52.451.108	Amparo Chávez	29-abr-14	26-jul-14	Ejecutada
Calle 44 A entre Carreras 37 y 39	El Vergel	Pavimento Nuevo	Álvaro Lázaro del Valle	43.903.001	Por definir	Se encuentra pendiente de firma de acta de Inicio. Está pendiente la Calidad del Bien, documento que suministra Bienes e Inmuebles.		Adjudicada Abril 08/2014 Por Ejecutar
Carrera 27G entre Calles 72W2 y 72W	Omar Torrijos			42.200.318				
Calle 72W entre Carreras 26M y 26I3	Los Lagos			142.477.788				

Fuente: Grupo Contratación S.I.V

METROCALI



Obra Terminal Calipso - Julio Rincón



**Avance a corte: Julio 22
de 2014**

Pre-construcción	Marzo 17/2014
Construcción	Abril 16/2014
Finaliza	Febrero 17/2015

VIGAS DE CIMENTACIÓN 35%

ZARPAS 40%

MURO PERIMETRAL - 25%

Fuente: Metrocalli S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre de 2014.

TRANSITO



Señalización y demarcación vial

La Secretaría de Transito informa que la demarcación vial de 8 zonas escolares y tres (3) vías con reductores de velocidad sin pintar, ubicadas de la siguiente manera:



LUGAR	DIRECCION
Polideportivo El Diamante	Cra. 30A con Cl. 42
Escuela el Diamante	Cl. 41 con Cra. 31.
Colegio Juvenil del Valle	Cra. 26H3 con Cl. 73.
Colegio Panamericano	Cl. 72U con Cra. 26H3.
IE Gran Colombia	Cra 28 D3 con Cl. 72F4.
IE Santa Teresita	Cra. D3 Cl. 72B.
Colegio Los Lagos	Cl. 72U Cra. 26H3.
Instituto Jordán Mazuera	Diag. 71 entre Cras. 26H2 y 26J
2 vías principales en:	Cl. 70 entre Cras. 28D3 y 28E
	Cl. 72F6 con Transv. 28E.

Se realizó en su totalidad el mes de Febrero de 2014, las dos vías principales solicitadas no se demarcarán porque:

- **Cl. 70 entre Cras. 28D3 y 28E**, vía se encuentra en construcción de obras complementarias del MIO.
- **Cl. 72F6 con Transv. 28E**. Vía se encuentra en malas condiciones, cuando la secretaria de Infraestructura la repare, se procederá a la demarcacion.

Los dos reductores de velocidad solicitados, tienen viabilidad positiva y serán construidos en 2015 con presupuesto 2014 en:

- Cl. 71 con Cra. 28E.
- Cra. 32BB entre Cls. 42 y 44.



Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

GOBIERNO



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Iluminación de parques con luz blanca

DIRECCION	BARRIO	INVERSION
CRA 28A CL 72M Y 72N	COMUNEROS II	\$7.255.691,00
CALLE 72H - CRA 28A	COMUNEROS II	\$23.568.423,00
CRA 28A1 CLL 72U y 72T	COMUNEROS II	\$25.785.382,00
CRA 32 CL 57	LOS COMUNEROS II	\$21.033.850,00
TV 28E CL 72F6 Y CL 72F5	CALYPSO	\$42.630.885,00
CRA 28 D3 CL 72 FY C 72 F2	CALYPSO	\$50.134.899,00
CRA 28D3 CL 70 Y CL 72F	CALYPSO	\$105.940.926,00
K 28 E / C 71B Y C 72	CALYPSO	\$25.415.976,00
C 72 y C 72A con K 28E	CALYPSO	\$24.761.965,00
CLL 72H CON TRANSV. 28E	CALYPSO	\$14.815.725,00
C 72 U / K 25 L	CHARCO AZUL	\$38.458.101,00
D 71 A1 CON CRA 24	CHARCO AZUL	\$62.271.473,00
K 28E2 / C 72 Y	EL POBLADO I	\$70.550.886,00
K 28 J / C 72 Y	EL POBLADO I	\$65.216.066,00
K 72Y / C 28F	EL POBLADO I	\$34.142.596,00
K 29A / C 51A Y C 52A	EL POBLADO I	\$89.296.142,00
C72M - K28H y K28I	EL POBLADO I	\$12.536.927,00
CRA 28H / CL 72P Y 72R	EL POBLADO I	\$10.076.917,00
C72V K 28E Y K 28E-2	EL POBLADO II	\$30.633.215,00
CL 71A -71 B K 27 Y K 28C	EL PONDAJE	\$129.630.291,00
K 28C Y 28D / C 70 Y 71B	EL PONDAJE	\$70.737.232,00
K 26P CL 72W-51	LOS LAGOS	\$40.972.961,00
K 28E4 CL 72P	LOS ROBLES	\$27.696.596,00
CL 72L CON TRASY 28I	LOS ROBLES	\$12.438.449,00
		\$22.990.124
CL 71 CRA26H	LLERAS RESTREPO	
CRA 72I CRA 28D2 D3	MARROQUIN	\$31.994.757,00
DGL 26G-5 TRANS 72S2	MARROQUIN III	\$6.118.348,00
C72U - DIAG 26G7	MARROQUIN III	\$9.559.504,00
KRA 26L CON DG 72A	RICARDO BALCAZAR	\$20.248.252,00
DG 70 CON KRA 26J	RICARDO BALCAZAR	\$35.715.129,00
C 72 / K 23 B	ULPIANO LLOREDA	\$41.179.398,00
CL 72B CRA 23C y 24	ULPIANO LLOREDA	\$13.231.705,00

La Secretaría de Gobierno informa que:

- Con corte agosto/2014 ha iluminado con luz blanca, treinta y dos (32) parques y espacios públicos en la comuna 13 con una inversión total de \$1.217 Millones de pesos.



- Los seis (6) parques o zonas verdes referidos por la comunidad, serán iluminados a finales de 2014.

EDUCACION



Programa «Educación Digital para Todos TIT@»




La Secretaría de Educación informa que para la ejecución del proyecto de educación digital para todos (TIT@) se han contemplado las siguientes etapas:

1. Diagnóstico de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda Ancha): Octubre a Diciembre de 2014
2. Adecuación de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda Ancha): 1er Trimestre de 2015.
3. Capacitaciones a docentes y directivos docentes, y pedagogía del proyecto con estudiantes y padres: 2do Trimestre de 2015
4. Entrega de equipos y mobiliarios y operación del proyecto: 3er Trimestre de 2015

En la Comuna 13 se entregarán 760 equipos de cómputo distribuidos así:

1. I.E El Diamante: Aulas 18 y 684 Computadores.
2. Sede Juan pablo II: Aulas 2 y 76 computadores.

Implementación de Jornadas Escolares Complementarias Comuna 13

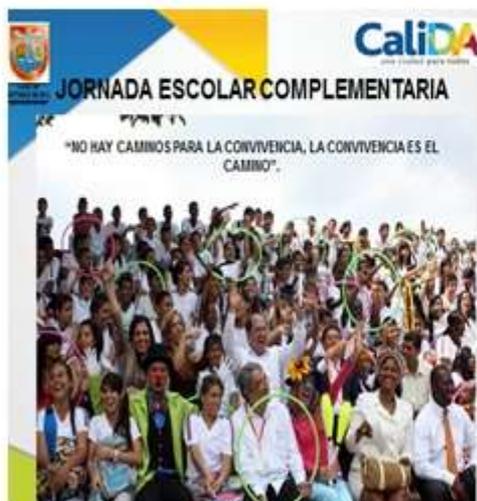

La Secretaria de Educación informa que el programa «Jornada Escolar Complementaria» inicia en Agosto de 2014.

- Beneficia: 30 IE de los barrios TIOS.
- Cobija: 14.500 estudiantes de los grados séptimo, octavo y noveno.
- Jornadas de: 9:00 am a 12:00 pm (jornada para los que estudian en la tarde) y 1:00 pm a 4:00 pm (jornada para los que estudian en la mañana).
- El programa incluye 14 alternativas: alimentación (almuerzo), música, salsa, danza moderna, danza clásica ballet, danza folclórica, teatro, teatro expresión libre, teatro callejero - zancos, cine digital, artes plásticas, matemática articulada, semillero de ciencias, emprendimiento y literatura. La estrategia organizativa será a través de clubes juveniles conformados con grupos de 25 estudiantes donde prevalecerá sus interés y habilidades.

Para esta primera fase en la Comuna 13 fueron priorizadas las siguientes I.E.O:

I.E.O Bartolomé Loboguerrero	I.E.O Santa Rosa
I.E.O Humberto Jordán Mazuera	I.E.O Diamante
I.E.O Luz Haidé Guerrero	I.E.O Jesús Villafañe franco



Inversiones infraestructura vigencias futuras 2015-2018

La Secretaría de Educación informa que invertirá con recursos propios \$500.000.000 a través de vigencias futuras 2015-2018, para la comuna 13 así:

Institución Educativa	Actividades	Valor de Obras	Vigencias			
			AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
Institución Educativa Santa Rosa Cubierta	Construcción de cubierta cancha múltiple 350 m2.	\$ 500.000.000	\$107.142.857	\$130.952.381	\$130.952.381	\$130.952.381



Anuncio Programa de Alimentación Escolar

La Secretaría de Educación informa que :

- Actualmente se está ejecutando el programa para el Fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el Municipio de Santiago de Cali.
- Vigencia: Junio – Diciembre 2014
- La Secretaría de Educación asumió el servicio directamente de suplemento alimenticio para 513 Instituciones oficiales, cumpliendo con los parámetros establecidos y el aporte nutricional específico para los niños.
- Entrega diariamente 8.050 raciones de alimentación en las seis (6) Instituciones educativas y las ocho (8) sedes de la comuna 13:

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	MODALIDAD	RACIONES
I.E.O BARTOLOMÉ LOBOGUERRERO	PREPARADOS	823
Sede ENRIQUE OLAYA HERRERA	PREPARADOS	856
I.E.O HUMBERTO JORDÁN MAZUERA	PREPARADOS	620
Sede MIGUEL CAMACHO PEREA	PREPARADOS	659
Sede VILLA BLANCA	PREPARADOS	423
Sede CHARCO AZUL	PREPARADOS	127
I.E.O SANTA ROSA	PREPARADOS	900
Sede JOSE CARDONA HOYOS	PREPARADOS	326
I.E.O JESÚS VILLAFAÑE FRANCO	PREPARADOS	530
Sede OMAIRA SANCHEZ	PREPARADOS	146
I.E.O TÉCNICO INDUSTRIAL LUZ HAYDEE GUERRERO	PREPARADOS	212
Sede RODRIGO LLOREDA CAICEDO	PREPARADOS	918
I.E.O EL DIAMANTE	PREPARADOS	870
Sede JUAN PABLO II	PREPARADOS	640
TOTAL		8.050



SALUD



Ampliación Hospital Carlos Holmes



La ESE Oriente desde el mes de marzo de 2014 inició las obras de remodelación de consulta externa del Hospital Carlos Holmes, la cual consta de:

PROYECTO AMPLIACIÓN HOSPITAL CARLOS HOLMES (4 Pisos)	
Piso 1	Área de parqueaderos y 19 consultorios.
Piso 2	Consulta Externa y el SIAU.
Piso 3	16 consultorios .
Piso 4	Auditorio, área para emisora comunitaria.
Nota: Cada piso cuenta con salas de espera y cajas, acceso a los 2 ascensores y a las escaleras de la edificación.	

La obra de remodelación se estima entregar en julio de 2015.

Desde enero de 2014, el gerente del Hospital socializo el plan de contingencia para la atención de la población asistente al Hospital. El personal médico, auxiliares de enfermería, enfermeros y la parte administrativa del Hospital Carlos Holmes, fueron distribuidos en los diferentes Centros y Puestos de Salud de la Comuna 13 y 14, de acuerdo a la disponibilidad de espacio y necesidades en cada establecimiento.


Para mayor información puede consultarse en:

- SIAU (Servicio de Información Atención al Usuario) ubicado en el Hospital Carlos Holmes
- Puntos de atención psicosocial de los puestos y centros de salud de la Comuna 13.

CULTURA



Formalización de los grupos culturales



Origen



La Secretaría de Cultura para el segundo semestre de 2014 realizara jornadas de fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la gestión cultural, con la orientación en:

- Formulación de proyectos a nivel Nacional y territorial.
- Planificación cultural.
- Acceso a programas de MinCultura.

Para participar en estas actividades, es necesario que las organizaciones y/o gestores culturales actualicen sus datos en el Directorio Cultural del Municipio: <http://www.cali.gov.co/cultura/>

En Julio de 2014 la oficina de Emprendimiento Cultural dio apertura a la Convocatoria "Estímulos" para apoyar 20 iniciativas de industria cultural de la ciudad que tendrá estímulos económicos y acompañamiento profesional a las organizaciones seleccionadas según las manifestaciones artística y cultural seleccionada.

Adicionalmente a través del profesional especializado de la comuna, los líderes culturales pueden presentar propuestas para la realización de "Plazas y Parques" vigencia 2015 en las comunas de Cali. Mayor información, llamar al 8859087 o acercarse a la Secretaría de Cultura y Turismo en la oficina 104.

