



# INVERSIONES DESTACADAS COMUNA 14

## SEGUIMIENTO FINAL Septiembre 9/2014

# INFRAESTRUCTURA



## Avance en Obras de Mantenimiento con Recursos propios 2014

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, asignó en Agosto/2014, \$293 millones de sobretasa a la gasolina para cinco (5) obras de mantenimiento vial en pavimento flexible equivalente a 2.755 mts2. Se está en el proceso de legalización del contrato, se espera ejecutarlas al finalizar el 2014, las vías a intervenir son:

OBRA	BARRIO	B.P.	CDP	VALOR OBRA	Área a Intervenir
Calle 107A entre Cras 28A y Diagonal 119	Las Orquídea	28816	3500040756	34.923.652	300
Calle 78 entre Carreras 26A y 26B	Alirio Mora Beltrán	28816	3500040756	41.302.384	660
Calle 79 entre Carreras 26C1 y 26D	Alirio Mora Beltrán	28816	3500040756	34.923.652	250
Calle 97 entre Carreras 27D y 29	Alfonso Bonilla Aragón	28714	3500040756	42.944.940	700
Carrera 26U entre Calles 73 y 79	Alfonso Bonilla Aragón	28816	3500040756	139.141.446	845
Fuente: Grupo de Contratación S.I.V				<b>\$ 293.236.074</b>	<b>2.755</b>

## Avance en Construcción de Anden Recursos propios 2014

OBRA	ORIGEN	VALOR OBRA	Área	Contrato
Calle 94 entre Carreras 27D y 28G	Sobretasa Gasolina	45.489.006	262 M2	Luis Carlos Quijano - Contrato No. 4151.0.26.1.285.16 del 16 de abril/2014



## Avance en obras de Bacheo con Recursos Propios



Foto: Obra de Bacheo Grupo Operativo Comuna 14



Foto: Obra de Bacheo Grupo Operativo Comuna 14

La Secretaría de Infraestructura y Valorización, realizó en Septiembre del 2013 el Bacheo de la **Diagonal 26K entre Calles 73 y Transversal 101**, con el grupo operativo .

Se está a la espera de la programación por parte del grupo Operativo de la Secretaría de Infraestructura, para ejecutar nueve (9) obras de bacheo en:

Dirección
Calle 91 entre Cra 27 y 28
Cra 27 A entre Calles 73 y 74
Cra 26I3 entre Calles 105 y 109
Diagonal 26 G8 entre Calles 73 y Transversal 77
Cra 27A entre Calle 91 y Transversal 103
Cra 26T entre Calles 106 y 108
Cra 26 P entre Calles 106 y 108
Cra 26 S entre Calles 106 y 108
Cra 26 J entre Calles 104 y 120





## Informe sobre Mantenimiento a Puentes Peatonales - Recursos propios 2013

La Secretaría de Infraestructura y Valorización entregó en diciembre/2013 en convenio con la Corporación para la Recreación Popular una inversión de \$1.5 millones de sobretasa a la gasolina/2013; en el mantenimiento a dos (2) puentes peatonales en el Barrio Manuela Beltrán:

OBRA	FECHA CONTRATO	VALOR OBRA	Clase	Área
Carrera 26K-1 con Calle 120	17-jul-13	733.824	Pintura esmalte para barandas tubulares ml	48
Carrera 26S con Calle 120	17-jul-13	776.630	Pintura esmalte para barandas tubulares ml	51
<b>Total Inversión Mantenimiento de Puentes \$ 1.510.454</b>			<b>Total Área Intervenida</b>	<b>99 mts2</b>

Fuente: Grupo de Contratación S.I.V

El 4 de Junio/2014 se declaró desierta licitación de \$667 millones mediante Resolución No. 4151.0.21.1323.2014, para el mantenimiento de once (11) puentes peatonales, con sobretasa del 2013. Antes de terminar el 2014, se retomara el proceso licitatorio:

OBRA	BARRIO	VALOR OBRA	Clase	Área Presupuestada
Calle 74 con Carrera26	Alirio Mora Beltrán	45.489.006	Platinas para apoyo de estructuras und.	20
Calle 77 con Carrera26P	Alfonso Bonilla Aragón	42.944.940	Pintura en esmalte en estructura metálica ml	22
Calle 78 con Carrera26	Alirio Mora Beltrán	139.141.446		25
Calle 79 con Carrera26	Alirio Mora Beltrán	47.515.411		25
Calle 80 con Carrera26P	Alfonso Bonilla Aragón	45.489.006		22
Calle 80E con Carrera26	Puertas del Sol	42.944.940	Pintura en esmalte para barandas tubulares ml	25
Calle 83 con Carrera26P	Alfonso Bonilla Aragón	139.141.446	Baranda metálica tubería galvanizada ml	20
Calle 84 con Carrera26	Puertas del Sol	41.302.384	Platinas para apoyos de estructuras und	10
Calle 86 con Carrera26P	Alfonso Bonilla Aragón	47.515.411	Pintura en esmalte en estructura metálica ml	22
Calle 91 con Carrera26T	Alfonso Lopez	34.923.652	Pintura en esmalte para barandas ml	40
Diagonal 26-C1 Canal Cauquita	Marroquin II	41.302.384	Pintura en esmalte en estructura metálica ml	25
<b>Valor obras declaradas desiertas \$</b>	<b>667.710.026</b>		<b>Total Área presupuestada</b>	<b>256 mts2</b>

Fuente: Grupo de Contratación S.I.V



## Avance de obras de Pavimentación con recursos de Situado Fiscal 2013

La Secretaría de Infraestructura y Valorización con una inversión de \$261.150.695 del situado Fiscal 2013, finalizó el pasado 11 de Julio del 2014, dos (2) obras de Pavimentación, mejorando la movilidad en 1.295 mts<sup>2</sup> en los Barrios Puertas del Sol y Manuel Marroquín II de la Comuna 14.

OBRA	BARRIO	CONTRATO No.4151.1.(07-26)	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR OBRA	FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	% AVANCE	Clase	Área
Calle 91 entre Cras 26B2 y 26C	Puertas del Sol	4151.0.26.1.487-13	15-ago-13	CONSORCIO COMUNA 14 Juan Carlos Lozano Quijano	110.547.837	Oct 21 / 2013	Julio 11/ 2014	100	Flexible	595
Transversal 80A entre Diagonales 26I2 y 26K	Manuel Marroquin II	4151.0.26.1.487-13	15-ago-13		150.602.858			100	Flexible	700



Foto: Transversal 80A entre Cras 26I2 y 26K- Fuente: Grupo de Contratación S.I.V . Ing. Oscar Londoño



# TRANSITO





## Avance sobre señalización y demarcación vial



La Secretaría de Tránsito informa que:

- La demarcación de las nueve (9) vías solicitadas por la comunidad se realizó entre los días 1 y 5 de Diciembre de 2013.

DIRECCION	BARRIO
Cl. 75 con Cra. 26D, Frente al Colegio Niño Jesús de Praga.	Alirio Mora Beltrán
Calle 108 entre Cras. 26M y 26K (colegios Dana María y Sion)	Manuela Beltran
Cl. 91 entre Cras. 27 y 28	Alfonso Bonilla Aragón
Cra. 27 con Av. Ciudad de Cali, 4 esquinas	Alfonso Bonilla Aragón
Calle 84 con Transv. 103	Promociones Populares
Cl. 84 con Cra. 26C	Los Naranjos II
Cl. 89 con Cra. 26B (pintar reductor de velocidad)	Puerta del Sol
Cra. 25 entre Cls. 84 y 86 (Colegio Compartir).	Ciudad Talanga (C21)

- El reductor de velocidad solicitado en la Cra. 25 con Cl. 84 barrio Puerta del Sol, fue construido a finales de 2013.





## Avance de semaforización



### La Secretaría de Tránsito informa que:

En Enero de 2014 realizó visita técnica para verificar viabilidad de semaforización de las 3 vías solicitadas con los siguientes resultados:

1. **Cl. 74 con Cra. 25 (C. C. Rio Cauca):** Se instaló un paso peatonal regulado mediante un sistema semafórico desde el 31 de diciembre/2013.
2. **Av. C. de Cali entre Cras. 28 y 28C (frente a un nuevo latir):** La Megaobra de la Ciudadela Educativa Nuevo Latir no construyó el puente peatonal ni entregó la conectividad peatonal segura frente a la portería principal que permita atravesar la Avenida Ciudad de Cali.
  - La Secretaría de Tránsito reiterara a la Secretaria de Infraestructura que realice obras físicas como tuberías, anclajes y cajas de paso para extender un sistema semafórico desde la Cl. 73 con Cra. 28D (troncal de Aguablanca),
  - Una vez cuente con las condiciones de infraestructura requeridas, procederá a instalar el paso peatonal semaforizado.
1. **Calle 73 con Diag. 26 (frente a Charco Azul):** Viabilidad negativa por ser una vía principal que cuenta con sistemas semafóricos instalados y funcionando perfectamente a escasos metros antes y después del punto solicitado.



Construyendo hoy  
la **Cali** del mañana


ALCALDÍA DE CALI

# METROCALI



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

## Avance en la frecuencia de las rutas del SITM <sup>1</sup>

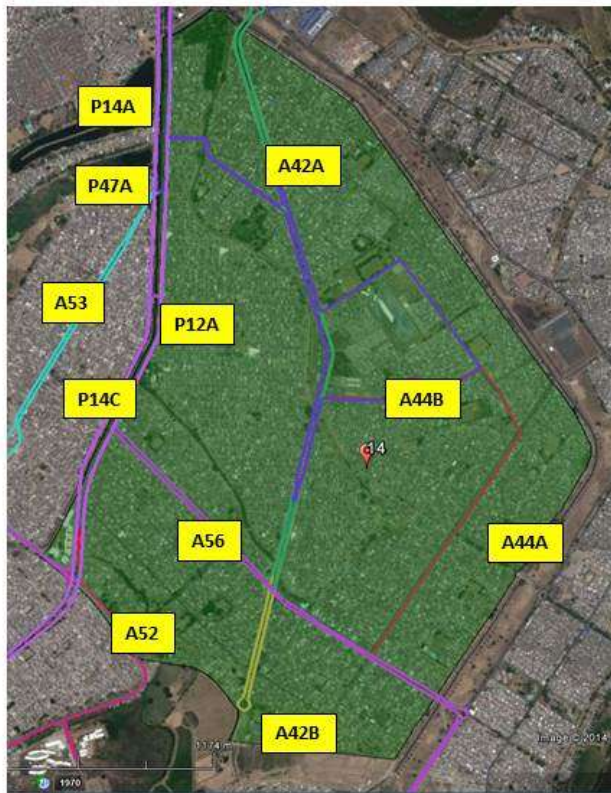

En la Comuna 14 el MIO presta un servicio de 9 rutas distribuidas así: 6 alimentadoras y 3 pretroncales.

RUTA	FLOTA ASIGNADA	RUTA	FLOTA ASIGNADA	RUTA	FLOTA ASIGNADA
A41A	15	A44A	8	P14A	17
A42A	6	A44B	4	P47A	16
A42B	3	A51	5	P47C	17
<b>TOTAL</b>		<b>91</b>			

En Abril/2014 se modificó el trazado de la ruta A44B en el sector de Puertas del Sol.

El mejoramiento de la frecuencia de las rutas en la comuna 14 queda supeditado al ingreso de la flota restante, esperada para el primer trimestre del 2015, cuando se culmine por parte de los operadores de Metrocali la compra de los buses y busetas que falta por salir de circulación.

Fuente: Metro Cali S.A. Dirección de Operaciones. Agosto de 2014.



## Avance en el mantenimiento de corredores pretroncales y paradas - Comuna 14

Metro Cali S.A. adjudicó a MECO S.A -SUCURSAL COLOMBIA- la adecuación funcional vial de la Avenida Ciudad de Cali, incluyendo el tramo que pasa por la comuna 14 mas 34 puntos de parada en dicha comuna, distribuidos así:

ADECUACION DE AVENIDA CIUDAD DE CALI (COMUNAS 14,13,15, 6 Y 7)				
INTERVENCIÓN	TRAMO		ESTADO	METROS L
Fresado, Bacheo y Parcheo	Avenida Ciudad de Cali entre Carrera 5 y Carrera 50 - Circuito		En Ejecución	6,530
PUNTOS DE PARADA - COMUNA 14				
Nº	RUTA	COMUNA	DIRECCION	ESTADO OBRA
1	A53	14	Calle 112 entre Carrera 26J5 y 26J	TERMINADA
2	A53	14	Calle 112 entre Carrera 26L y 26K1	TERMINADA
3	A53	14	Calle 112 entre Carrera 27 y 26Q	TERMINADA
4	A81	14	Calle 73 entre Carrera 26B2 y 26B1	TERMINADA
5	A81	14	Calle 73 entre Carrera 26G4 y 26G3	TERMINADA
6	P47C	14	Calle 73 entre Carrera 26H3 y 26H2	TERMINADA
7	A51	14	Calle 73 entre Carrera 26M y Diagonal 26M	TERMINADA
8	A51	14	Calle 73 entre Carrera 27 y 26U	TERMINADA
9	A42A	14	Calle 79 entre Carrera 28C y 28D	TERMINADA
10	P12A	14	Calle 79 entre Carrera 28C y 28D	TERMINADA
11	A51	14	Calle 79 entre Carrera 28D y 28C	TERMINADA
12	P21A	14	Carrera 27 entre Calle 106 y Transversal 103	TERMINADA
13	A53	14	Carrera 27 entre Calle 108 y 109	TERMINADA
14	P21A	14	Carrera 27 entre Calle 114 y 113	TERMINADA
15	A51	14	Carrera 27 entre Calle 81 y 80	TERMINADA

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre de 2014.



## Avance en el mantenimiento de corredores pretroncales y paradas - Comuna 14

N°	RUTA	COMUNA	PUNTOS DE PARADA - COMUNA 14	
			DIRECCION	ESTADO OBRA
16	A51	14	Carrera 27 entre Calle 96 y 95	TERMINADA
17	A51	14	Carrera 27 entre Calle 110 y 111	TERMINADA
18	A51	14	Carrera 27 entre Calle 76 y 77	TERMINADA
19	A51	14	Carrera 27 entre Calle 85 y 86	TERMINADA
20	A51	14	Transversal 103 con Diagonal 260	TERMINADA
21	A51	14	Transversal 103 con Calle 73C	TERMINADA
22	A51	14	Carrera 27 entre Calle 91 y 96	TERMINADA
23	A51	14	Transversal 103 entre Calle 74 y Carrera 26B2	TERMINADA
24	A51	14	Transversal 103 entre Calle 75 y 74	TERMINADA
25	A51	14	Transversal 103 entre Calle 76 y 77	TERMINADA
26	A51	14	Transversal 103 entre Calle 77 y 76	TERMINADA
27	A52	14	Transversal 103 entre Calle 79 y 78	TERMINADA
28	A44B	14	Transversal 103 entre Calle 79 y 79A	TERMINADA
29	A51	14	Transversal 103 entre Calle 84 y 80F	TERMINADA
30	A44A	14	Transversal 103 entre Calle 95 y 92	TERMINADA
31	A52	14	Transversal 103 entre Calle 95 y 92	TERMINADA
32	A51	14	Transversal 103 entre Carrera 26A2 y 26A3	TERMINADA
33	A52	14	Transversal 103 entre Carrera 27B y 27A	TERMINADA
34	A52	14	Transversal 103 entre Carrera 27C y 27D	TERMINADA
35	A44B	14	Transversal 103 entre Diagonal 26I y 26I1	TERMINADA
36	A51	14	Transversal 103 entre Diagonal 26P17 y 26P16	TERMINADA
37	A44B	14	Transversal 103 entre Diagonal 26P3 y 26P4	TERMINADA

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre de 2014.



# DAGMA





## Avance en la recuperación del Ecoparque Pizamos.

El DAGMA informa que, realizó las siguientes acciones:

**Mantenimiento del parque:** A Sep/2014 se continúa con las actividades de mantenimiento del Ecoparque; control de caracol africano y hormiga arriera, desarrollo de jardines para mariposas, poda de árboles y corte de prado. El DAGMA contrató 4 personas para el mantenimiento y conservación del parque: (2) guarda parques, (1) técnico y (1) coordinadora.



**Agricultura Urbana:** A partir de Enero del 2014 se empezó a implementar el Plan Estratégico de Agricultura Urbana que incluye:

- Manejo del uso del agua
- Mantenimiento del uso de las parcelas
- Compra de herramientas e insumos para llevar a cabo las actividades de mantenimiento y agricultura en el Ecoparque
- Siembra y manejo de 36 parcelas con hortalizas, aromáticas medicinales y frutales manejadas por un grupo de 35 integrantes de la tercera edad de la comuna 14 capacitados a través de 10 talleres de agricultura urbana.

### **Seguridad en el Ecoparque:**

- La Secretaría de Gobierno efectuó la iluminación total del Ecoparque.
- Se presentó a la CVC un proyecto por sobre tasa ambiental para el cerramiento del parque y mejoramiento de toda la infraestructura de baños, caseta, aula, auditorio y los juegos infantiles.
- Se tiene prevista gestionar con el Sena una alianza para vincular y capacitar a jóvenes de la comuna 14, para implementar una granja agroecológica en el ecoparque.



## Avance en control de contaminación ambiental en el canal oriental y cauquita sur de la comuna 14

### El DAGMA informa que:

Con recursos del 2013 y 2014 se asignó contrato de \$1.238 Millones.

### Cronograma:

- **Firma de acta de inicio:** segunda semana de septiembre/2014
- **Socialización a la Comunidad:** fecha a definir el 9 de septiembre en reunión entre el DAGMA y el contratista.
- **Terminación de la obra:** Diciembre de 2014.

### El proyecto contempla:

- Construcción de estructura de captación y un interceptor para direccionar las aguas residuales a la PTAR, con esta obra se busca eliminar el aporte de aguas residuales que realiza el canal cauquita sur al canal oriental.
- Para proteger la estructura de captación y el interceptor, se realizara una obra complementaria, consistente en entubar aproximadamente 60 metros lineales en el punto donde se conectan el canal cauquita sur y canal oriental entre los barrios Marroquín I y Alfonso Bonilla Aragón cerca a la estación Los Mangos.
- De esta manera se podrán eliminar las conexiones erradas que vierten aguas residuales al canal Cauquita Sur en su paso por la comuna 14, evitando así que dicha contaminación llegue al canal oriental y posteriormente al Rio Cauca.



Obras de control de vertimientos  
en el canal cauquita

# EMCALI





## Informe sobre el entamboramiento de los canales cauquita sur y figueroa



EMCALI informa que:

En Julio/2014 se efectuó una reunión entre el Gerente General Dr. Oscar Pardo, el Departamento de Ingeniería, la Dirección de responsabilidad social de EMCALI, el profesional del C.A.L.I 14 y líderes de la comuna 14, en la cual se plantearon tres alternativas relacionadas a continuación:

Posibles Fuentes de Financiación a Gestionar	Gestión Realizada	Descripción de la Obra	Estado
Fondo Adaptación del Gobierno Nacional	Se envió la propuesta al Fondo Adaptación en Julio 2014	Entubamiento de 1,030 Mtrs. lineales del Canal Cauquita Sur, iniciando en la Transversal 103 con Diagonal 26P 18 hasta la calle 73 con carrera 26P, beneficiando los barrios: Marroquín I, Marroquín II y Alfonso Bonilla Aragón.	En agosto 15/2014 el Fondo Adaptación dio concepto negativo.
Ventanilla Única del Ministerio de Ambiente y Vivienda	Se están reuniendo los 24 documentos requeridos para presentar la propuesta a la Ventanilla Única.		Se cuenta con planos, presupuesto y especificaciones técnicas y se debe tramitar permisos del DAGMA, Planeación Municipal y Bienes Inmuebles
Recursos CONPES del Gobierno Nacional para el 2016			

EMCALI tiene lista la documentación que esta bajo su competencia y espera iniciar trámites de permisos ante la Alcaldía en el mes de septiembre/2014. Una vez se complete la documentación se presentará la propuesta a la Ventanilla Única de Minambiente.



Construyendo hoy  
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

# VIVIENDA



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

## Avance en Mejoramiento de Vivienda



Foto: Secretaría de Vivienda



Foto: Secretaría de Vivienda

La Secretaría de Vivienda informa que entre el 2013 y el 2014 se han asignado un total de \$208 Millones para subsidios de mejoramiento de vivienda en la comuna 14, previo cumplimiento de los requisitos como lo establece el Acuerdo 049 de 1999.

Vigencia	No. Resolución	No. Familias	Observación
2013	Res.395/2013	24	Ejecutados en 2013 en los Barrios Puertas del Sol IV, V, VI y VII
2014	Res.253 Abril 23/2014	9	Tiene contratista asignado. Se inició proceso de socialización a la comunidad para iniciar obras.
2014	Res.371 Junio 16/2014	1	Tiene contratista asignado. Se inició proceso de socialización a la comunidad para iniciar obras.
2014	Res.485 Agosto 13/2014	5	En proceso de notificación y posteriormente se iniciará proceso de licitación.
2014	Res.511 Agosto 25/2014	2	En proceso de notificación y posteriormente se iniciará proceso de licitación.
<b>Total 2013- 2014</b>		<b>41</b>	

Los términos de ejecución son de 120 días, a partir del inicio de la obra.

El subsidio aplica únicamente para barrios desarrollados por la Secretaría de Vivienda y el Fondo Especial de Vivienda, su monto máximo es de \$5 millones, cubriendo hasta agotar recursos las siguientes opciones de obras: Adecuación de cocinas, baños y techos.





## Avance titulación en la comuna 14

La Secretaría de Vivienda informa que a septiembre de 2014, se han titulado 68 predios en la comuna 14, así:

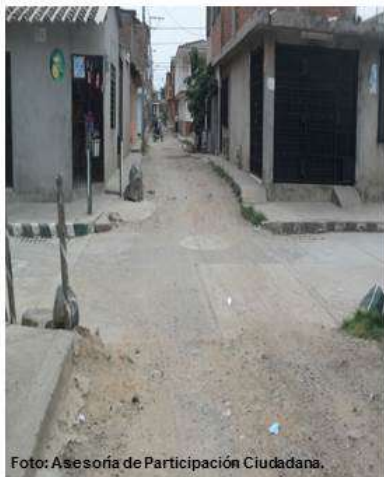


Foto: Asesoría de Participación Ciudadana.

- ✓ Puertas del Sol - Sector 5: 3 predios
- ✓ Quintas del Sol: 65 predios

En Septiembre/2013 con la asistencia de 50 personas se realizó en el Polideportivo de Puertas del Sol, un taller sobre:

**1. Titulación y de mejoramientos de vivienda**, para los adjudicatarios de Quintas del Sol y Puertas del Sol IV, V, VI y VII que están al día o que cancelaron su obligación y que aparezcan como los adjudicatarios originales.

**2. Asesoría técnica y jurídica para iniciar proceso de prescripción** adquisitiva de dominio, para familias que demuestren ser poseedoras de inmuebles ubicados en lotes privados y que cumplan con los requisitos de la Ley 1561/2012.

Se reitera que los predios ubicados en los barrios Alfonso Bonilla Aragón - sector la Libertad y Caney, Orquídeas y Manuela Beltrán no hacen parte de los predios de la Secretaría de Vivienda, siendo de particulares, por tanto no los puede titular.



## Aprobación Proyecto de acuerdo de condonación de hasta un 99% de intereses y rebaja de tasa de interés para los programas de vivienda de la Secretaría de Vivienda Social (c)



Foto: Alcaldía de Cali.



El 10 de septiembre de 2013, fue aprobado por el Concejo Municipal el proyecto de Acuerdo N° 077 presentado por la Secretaría de Vivienda de Cali, que autoriza la condonación de hasta el 99% de intereses causados en mora y una rebaja de 10 puntos en la tasa de interés que oscilaba entre el 10% y el 12% y que quedará en el 1% anual.

Este acuerdo beneficia a 6.930 hogares de 15 comunas, que recibieron vivienda proveniente del Fondo Especial de Vivienda – FEV de la Alcaldía (4.912) y de la Secretaría de Vivienda de Cali (2.013).

Del 100% de los beneficiarios de este proyecto de acuerdo, 349 adjudicatarios residen en la Comuna 14. (Ver Siguiendo Anexo).

NOTA: El acuerdo incentiva a 451 adjudicatarios de los programas de la Secretaría de Vivienda Social y Fondo Especial de Vivienda que se encontraban al día y que no habían recibido subsidio Municipal y que cumplen con los requisitos establecidos en el acuerdo No.49 de 1999 y el decreto No. 0416 de 2000, con la asignación de dicho subsidio.



# EDUCACION





## Informe a la Implementación de Jornadas Escolares Complementarias Comuna 14

La Secretaría de Educación informa que el programa «Jornada Escolar Complementaria»:



- Inicia: Agosto de 2014.
- Beneficia: 30 I.E. de los barrios TIOS del municipio
- Cobija: 14.500 estudiantes de los grados séptimo, octavo y noveno.
- Jornadas de: 9:00 am a 12:00 pm (jornada para los que estudian en la tarde) y 1:00 pm a 4:00 pm (jornada para los que estudian en la mañana).
- El programa incluye 14 alternativas: alimentación (almuerzo), música, salsa, danza moderna, danza clásica ballet, danza folclórica, teatro, teatro expresión libre, teatro callejero - zancos, cine digital, artes plásticas, matemática articulada, semillero de ciencias, emprendimiento y literatura. La estrategia organizativa será a través de clubes juveniles conformados con grupos de 25 estudiantes donde prevalecerá sus interés y habilidades.
- Para esta primera fase en la Comuna 14 fueron priorizadas las siguientes I.E.O:
  - **I.E.O Monseñor Ramón Arcila**
  - **I.E.O Anunciación**
  - **I.E.O Gabriela Mistral**
  - **I.E Nuevo Latir**

## Avance de comedor estudiantil y revisión de la calidad de los refrigerios en la I.E.O Los Naranjos sede de I.E.O La Anunciación

La Secretaría de Educación informa que :



- Actualmente se está ejecutando fortaleciendo el programa de alimentación escolar en el Municipio de Santiago de Cali.
- Vigencia: Junio – Diciembre 2014
- La Secretaría de Educación asumió el servicio directamente de suplemento alimenticio para 513 Instituciones oficiales, cumpliendo con los parámetros establecidos y el aporte nutricional específico para los niños.
- Actualmente en la Comuna 14, entrega diariamente **6.944 raciones de alimentación** en las cuatro (4) Instituciones educativas y las ocho (8) sedes de la comuna :



NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA / SEDE	MODALIDAD	RACIONES
<b>I.E.O MONSEÑOR RAMON ARCILA</b>	PREPARADOS	360
Sede RAÚL SILVA HOLGUÍN	PREPARADOS	909
Sede ALFONSO REYES ECHANDIA	PREPARADOS	254
Sede PUERTAS DEL SOL IV Y V	PREPARADOS	416
<b>I.E.O LA ANUNCIACION</b>	PREPARADOS	720
Sede LOS NARANJOS	LISTOS	380
Sede PUERTA DEL SOL	PREPARADOS	594
<b>I.E.O GABRIELA MISTRAL</b>	PREPARADOS	821
Sede ISAIAS HERNAN IBARRA	PREPARADOS	636
Sede ELIAS SALAZAR GARCIA	PREPARADOS	450
Sede DAMASO ZAPATA	LISTOS	304
<b>I.E.O NUEVO LATIR</b>	PREPARADOS	1.100
<b>TOTAL</b>		<b>6.944</b>





## Computadores para Educar 2013 y 2014

La Secretaría de Educación Municipal a través del programa Computadores para Educar, ha entregado con corte a agosto/2013 un total de 140 computadores en las Instituciones Educativas de la Comuna 14, distribuidos de la siguiente manera:

Comuna	Nombre Institución Educativa	Nombre Sede	TOTAL CPE
14	IE GABRIELAMISTRAL	<b>GABRIELA MISTRAL</b>	40
		ISAIASHERNAN IBARRA	40
		ELIAS SALAZAR GARCIA	40
		DAMASO ZAPATA	20

Se entregaron en el 2014 un total de 80 computadores a la siguiente Institución Educativa y sus sedes de la Comuna 14:

Comuna	Nombre Institución Educativa	Nombre Sede	TOTAL CPE
14	IE MONSEÑOR RAMON ARCILA	<b>MONSEÑOR RAMÓN ARCILA</b>	10
		RAUL SILVA HOLGUIN	40
		ALFONSO REYES ECHANDIA	30





## Avances de equipos de cómputos para las I.E.O en la Comuna 14



La Secretaría de Educación informa que para la ejecución del proyecto de educación digital para todos (TIT@) se han contemplado las siguientes etapas:

1. Diagnóstico de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda Ancha): Octubre a Diciembre de 2014
2. Adecuación de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda Ancha): 1er Trimestre de 2015.
3. Capacitaciones a docentes y directivos docentes, y pedagogía del proyecto con estudiantes y padres: 2do Trimestre de 2015
4. Entrega de equipos y mobiliarios y operación del proyecto: 3er Trimestre de 2015

**En la Comuna 14 se entregarán 722 equipos de cómputo distribuidos así:**

1. **I.E Monseñor Ramón Arcila:** Aulas: 10 y 380 Computadores.
2. **Sede Raúl Silva Holguín:** Aulas: 6 y 228 computadores.
3. **Sede Alfonso Reyes Echandía:** Aulas: 1 y 38 computadores
4. **Sede Puertas del Sol IV y V:** Aulas: 2 y 76 Computadores.



## Avance en Intervenciones en infraestructura Educativa



La Secretaría de Educación informa:

1. En enero 8 de 2014 se entregaron los suministros de materiales de obra (Pintura, thinner, brochas, rodillos y cinta de enmascarar) a las sedes centrales:

- **I.E.O Monseñor Ramón Arcilla**
- **I.E.O La Anunciación**
- **I.E.O Gabriela Mistral.**

2. Con recursos propios en Diciembre de 2013 se realizó la recuperación de la cubierta de la cancha múltiple de la **I.E.O Monseñor Ramón Arcilla.**

- Costo obra: \$39.074.794

3. Entre mayo y julio de 2014, se realizó obra de adecuación de pisos de la cubierta de la **Sede Puertas del Sol IV y V**, sede perteneciente a la I.E.O Monseñor ramón Arcilla.

- Total Obra: \$50.000.000 (Interventoría por \$2.380.952).



## Avances sobre dotación de mobiliario a la I.E.O de la comuna 14 y sus sedes

La Secretaría de Educación informa que en Mayo de 2014 se realizó la entrega de 280 sillas universitarias re manufacturadas (en perfecto estado) que se distribuyeron en dos (2) Instituciones Educativas y sedes de la Comuna 14:

Comuna	Institución Educativa	Dotación	Cantidad
14	Monseñor Ramón Arcila	Silla Universitaria	230
	Gabriela Mistral	Silla Universitaria	50

La Secretaría de Educación informa que para la segunda fase de dotación mobiliario escolar a entregar en el segundo semestre de 2014, se entregarán 760 pupitres unipersonales y 770 sillas universitarias las cuales se distribuirán en las siguientes I.E.O:

Comuna	Institución Educativa	Dotación	Cantidad
14	Monseñor Ramón Arcila	Silla Universitaria	70
		Pupitre unipersonal	760
	La Anunciación	Silla Universitaria	100
	Gabriela Mistral	Silla Universitaria	600





# SALUD



## Avance sobre mejor asignación de citas <sup>(c)</sup>

La ESE Oriente informa que para mejorar la asignación de citas a los usuarios del Centro de Salud Manuela Beltrán, se han implementado las siguientes acciones:



- **Se realizaron adecuaciones en el Centro de Salud Manuela Beltrán**, con una inversión de \$900 millones, el 16 de junio/2014, se hizo entrega de la obra la cual consta de: 8 nuevos consultorios, 2 de atención prioritaria, 1 sala de procedimientos, 3 cajas, 1 tanque subterráneo de agua.



- **Las historias clínicas fueron sistematizadas**, para agilizar los procesos de tramitación de órdenes y mejorar la consulta día de las citas canceladas por los usuarios.
- **La puesta en marcha del Contac Center en la ESE Oriente**: aún no se considera posible, hasta tanto no se culmine con todas las obras de mejoramiento de infraestructura en toda la ESE Oriente.



## Avance sobre mejoramiento de la infraestructura de Centros y Puestos de Salud de la Comuna 14 <sup>(P)</sup>



La ESE Oriente informa que:

- Centro de Salud las Orquideas: La Junta Directiva de la ESE Oriente aprobó diseños y \$650 millones en el presupuesto del 2014, para la reconstrucción de este puesto de salud. Esta en proceso los tramites de contratación.
- Centro de Salud Intervenidas: en diciembre/2013 se instaló la cubierta del corredor de ingreso al centro y se construyeron muretes para que las usuarios puedan sentarse. Se contrato mayor número de profesionales.





# DEPORTE



## Avance en adecuación de escenarios deportivos

La Secretaría de Deporte informa que con presupuesto de 2014, se invertirán de 907 millones (BP 42977), pendientes del situado fiscal de 2011, destinados en la adecuación de los escenarios deportivos y recreativos de la comuna.



En el primer semestre del 2014, se licitó y adjudicó la adecuación de tres (3) escenarios deportivos, por valor de \$407 Millones:

1. **Adecuación Polideportivo Las Orquídeas**: \$60.5 Millones. En las Carreras 27D Y 27F entre Calles 108 Y 110.
2. **Adecuación Escenario Deportivo Puertas del Sol I**: por valor de \$ 297 Millones. En la Calle 84 entre Carreras 26G y 26.
3. **Adecuación Escenario Deportivo Polideportivo Marroquín I**: por valor de \$48 Millones. En la Transversal 87 Con Diagonal 26 P3.

Para el caso de los seis (6) proyectos restantes por valor de \$500 millones, se encuentran en la primera fase de licitación.



Construyendo hoy  
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

# BIENESTAR



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI



ACTIVIDADES ADULTO MAYOR		
ACTIVIDAD	OBJETIVO	DESARROLLO ACTIVIDAD
"Intercambio Generacional"	Espacio que promoverá el encuentro con los jóvenes, personas mayores y personal docente.	Se llevó a cabo el día miércoles 20 de agosto, desde las 7:30 a.m., en la sede Francisco José de Caldas, de la I.E. Escuela Normal Superior Farallones de Cali. Dirección carrera 4 oeste No. 12A-59, B/Bellavista.
Exposición Fotográfica:	"Nuestros Legados" A través de una muestra fotográfica se busca sensibilizar a los asistentes de que envejecer no es deteriorarse, sino que por el contrario es fortalecer, crecer y construir nuestra historia.	Se dio inicio a la exposición el día miércoles 20 de agosto a las 2:00 p.m. y del jueves 21 al viernes 29 de agosto de 9 am a 6 pm jornada continua, en el Acuaparque de la Caña de Azúcar
Intercambio de Tradiciones y Saberes	Por medio de un espacio de encuentro entre la sociedad, familia, y la comunidad se promoverán relaciones intergeneracionales respetuosas, saludables y equitativas entre géneros, generaciones y culturas, fomentando un reconocimiento y cambio de imaginarios, rescatando por medio de estas, el rol que desempeña el adulto mayor dentro de estos grupos poblacionales a manera de ejemplo de vida.	El Evento se llevó a cabo en el Acuaparque de la Caña de Azúcar, el día miércoles 27 de agosto, desde las 10:00 a.m. a 6:00 p.m. con las siguientes presentaciones: <ol style="list-style-type: none"> <li>1, Presentación de la cultura afrodescendiente "Mi Sangre".</li> <li>2. Presentación de la cultura indígena "Nuestro Mayo</li> <li>3. Presentación de la cultura campesina "Nuestro Sabio".</li> </ol>



## Avance a priorizar ayudas técnicas para adultos mayores y personas en situación de discapacidad

La Secretaría de Bienestar Social informa que el proyecto: Dotación del Banco de Ayudas Técnicas para la atención a personas con discapacidad de las Comunas TIOS de Santiago de Cali con BP 044606.

- Valor del proyecto \$202 millones de dependencia
- Número de ayudas técnicas a adquirir: 320.
- Estado: En ejecución desde Julio de 2014
- Ayudas entregadas en la comuna 14 a la fecha :
  - 4 Sillas Especiales
  - 8 Sillas Semideportivas
  - 14 Sillas Estándar



Cualquier solicitud llevarla directamente a la oficina de discapacidad, primer piso Torre Alcaldía.



Construyendo hoy  
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

# GOBIERNO



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI



## Avance en la instalación de cámaras de seguridad

La Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad informa que:

• A principios de Noviembre de 2013 se instalaron siete (7) cámaras de seguridad en la comuna, quedando con una dotación de 17 cámaras en funcionamiento.



COMUNA 14					
EXISTENTES					
No.	BARRIO	DIRECCION	No.	BARRIO	DIRECCION
1	LAS ORQUIDEAS	TR 103 KR 27 La Casona	6	MARROQUIN II	AV CC DIG 26 B Charco Azul
2	ALFONSO BONILLA ARAGON	DIG 26 AV CC Est Mangos	7	ALFONSO BONILLA ARAGON	CL 84 KR 26 Puertas del Sol
3	ALFONSO BONILLA ARAGON	KR 27 & AV CC Cuatro Esquinas	8	ALIRIO MORA BELTRAN	CL 80 KR 26 Est Bombeo Aguablanca
4	ALFONSO BONILLA ARAGON	AV CC KR 28 Ciudadela	9	NUEVO LATIR	KR 28 D AV CC Ciudadela Nuevo Latir Parte Posterior
5	MARROQUIN II	CL 73 DIG 26 F	10	ALFONSO BONILLA ARAGON	KR 28 D AV CC
INSTALADAS 2013					
1	LAS ORQUIDEAS	KR 28 CL 112	5	GLORIETA CC RIO CAUCA	KR 26 B 1 CL 112
2	MANUELA BELTRAN	KR 27 CL 112	6	MANUELA BELTRAN	KR 26 I CL 112
3	CAI BONILLA ARAGON	TRAV 103 KR 28-4 GLORIETA	7	MARROQUIN II	DIAG 26 C 2 CL 75 B
4	SECTOR CHIQUIS Y LA NADA	KR 27 D CL91			



## Avance en la iluminación con luz blanca

Dirección	Barrio	inversión
CRA 27D CL 94	ALF BONILLA ARAGON	\$ 69.397.402,00
CRA 26 / CL 88	ALF BONILLA ARAGON	\$ 14.661.372,00
CRA 27D CL 88	ALF BONILLA ARAGON	\$ 25.989.063,00
CL 75 CRA 26U	ALF BONILLA ARAGON	\$ 28.013.952,00
CL 81 CRA 27B	ALF BONILLA ARAGON	\$ 22.545.438,00
TRANSV 103 CRA 28	ALF BONILLA ARAGON	\$ 15.869.684,00
C 73A / DG 26CY DG 26 D	ALIRIO MORA BELTRAN	\$ 111.946.657,00
C 79 K 26B Y 26B1	ALIRIO MORA BELTRAN	\$ 1.996.740,00
C80E - K26B3Y K26C	ALIRIO MORA BELTRAN	\$ 23.939.910,00
C 116 / K 26B Y K 26 C	INVICALI	\$ 31.137.122,00
CRA 28 CL 116 Y CL 119	LAS ORQUIDEAS	\$ 70.683.378,00
CRA 28A CL 107Y 107B	LAS ORQUIDEAS	\$ 17.763.895,00
CRA 26 T 103 - CL 106 / D 26P17	LOS NARANJOS I	\$ 488.160.740,00
C 77 / K 26 G1	LOS NARANJOS I	\$ 171.027.751,00
CL 75A CRA 26G3	LOS NARANJOS I	\$ 23.221.587,00
C 116 / K 26 P	MANUELA BELTRAN	\$ 21.057.908,00
C 99 / K 26 D Y K 26 C	MANUELA BELTRAN	\$ 56.781.915,00
C 108 / K 26 H1	MANUELA BELTRAN	\$ 53.039.202,00
C118 - K26 J5	MANUELA BELTRAN	\$ 9.661.036,00
CL 116 CRA 26C	MANUELA BELTRAN	\$ 33.801.883,00
CRA 26D CL 108	PUERTA DEL SOL	\$ 54.958.623,00
C 94 / K 26 Y 26C	PUERTA DEL SOL	\$ 35.030.022,00
CL 84 CRA 26C	PUERTA DEL SOL	\$ 24.544.697,00
CRA 26B3 CL 80 y 80C	TERCER MILENIO	\$ 27.038.124,00
CL 80E CRA 26D	TERCER MILENIO	\$ 29.729.414,00
<b>TOTAL INVERTIDO</b>		<b>\$ 1.461.997.515,00</b>

### La Secretaría de Gobierno informa que:

- A agosto de 2014 se han iluminado con luz blanca veinticinco (25) parques y espacios públicos en la comuna con una inversión total de **\$ 1.462 Millones.**



- El Eco-parque Píamos fue iluminado con luz amarilla el 2 de diciembre de 2013, por directriz expresa del DAGMA para la no afectación del ecosistema.
- El parque ubicado en la Cra. 28 con transversal 103 fue iluminado en febrero del 2014 y El parque ubicado en la Cra. 28 entre Calle 94 y 95 será iluminado en el segundo semestre de 2014



## Avance en la intervención con jóvenes Torneo Calidoso



[Cali.gov.co](http://Cali.gov.co)



**La Secretaría de Gobierno informa que:**

En abril/2014 en asocio con la Secretaría de Deporte, se implementó en las comunas 6, 13, 14, 15 y 16 la segunda fase del torneo de Fútbol Calidoso.

El cual, conto con la participación de 900 jóvenes, en situación de riesgo, seleccionados con el apoyo de las JAC.

El torneo, tiene como objetivo premiar la hermandad, la amistad y la no violencia.

El torneo esta en desarrollo y culminará en Septiembre de 2014.





## Bandas desarticuladas con influencia en la Comuna 14



La Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad informa que:

- Mediante el accionar de la Policía Metropolitana de Cali, se logró desarticular en el 2013 una (1) banda delincuencial "Los Gatos" sindicada del delito de homicidio agravado, que tenía su radio de acción en la comuna 14.

Comuna 14			
BANDA DELINCUENCIAL	DELITO	CAPTURAS	Comunas donde delinquieran
banda delincuencial "Los Gatos"	Homicidio	2	14
