



INVERSIONES DESTACADAS COMUNA 20

3ER. SEGUIMIENTO
Octubre 20/2014

Construyendo hoy
la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

METROCALI




ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Información sobre mano de obra de la comuna 20 vinculada al MIO Cable



Metrocali informa que el Contratista es quien selecciona y contrata directamente el personal. A agosto/2014 ha cumplido con los parámetros de vinculación así

	Meta de vinculación de residentes de la comuna 20	% de vinculación a Octubre/2014	Observación
Mano de obra No Calificada	50%	69%	De 230 empleos generados, 187 son de la comuna 20, para cimentación de las pilonas y obras civiles de las estaciones.
Mano de obra en situación de discapacidad	1%	2%	

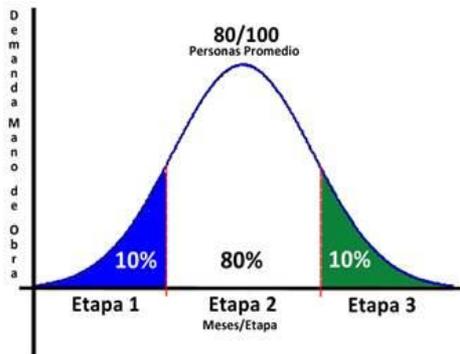

La vinculación del personal tiene un ciclo, el cual se muestra en la figura y en la tabla siguiente:

Etapa	Meses	Actividad	Distribución del personal
1	Abril - Mayo de 2014	Remoción de Tierra	10%
2	Junio - Diciembre de 2014	Construcción	80%
3	Enero - Marzo de 2015	Acabados	10%

Fuente: Metrocali S.A. Septiembre - 2014.



Información sobre mano de obra de la comuna 20 vinculada al MIO Cable

EMPLEADOR	CATEGORÍA	CONTRATADOS	% PARTICIPACIÓN COMUNA 20
CONALVIAS	Profesional	6	60%
	Técnico	10	
	Mano de obra no calificada	25	
SEGURIDAD R F	Profesional	0	100%
	Técnico	0	
	Mano de obra no calificada	23	
GEMA	Profesional	6	0,4
	Técnico	0	
FABIO CORREA-EXC Y AFIR.	Profesional	0	0,3
	Técnico	2	
	Mano de obra no calificada	2	
CONSTRUSERVICIOS HOLGUIN	Profesional	0	67%
	Técnico	6	
	Mano de obra no calificada	9	
ESTRUCTURAS ROJAS	Profesional	0	83%
	Técnico	4	
	Mano de obra no calificada	19	
MEGACONSTRUCCION	Profesional	0	54%
	Técnico	8	
	Mano de obra no calificada	15	
TOTAL		124	71%

La contratación de mano de obra para la construcción del MIO Cable que se reactivó en marzo de 2014, ha sido fluctuante, el punto más alto fue 185 trabajadores, a agosto/2014 estaba en 124 trabajadores de los cuales 83 son habitantes de la comuna 20, es decir el 71%.

Fuente: Metrocali S.A. Octubre - 2014.



Información sobre los beneficios del MIO Cable



Metrocali informa que con la puesta en marcha del SITM- MIO CABLE en la comuna 20, se generaran beneficios de movilidad, urbanísticos, ambientales y turísticos como:

- Transporte mejor adecuado y seguro hacia la ladera.
- Ampliación de cobertura e integración con el resto del SITM- MIO
- Mejoramiento urbanístico: 3 estaciones-plazoletas en la parte de ladera de la comuna 20.
- Cero emisiones contaminantes
- Nuevas potencialidades turísticas

Durante el proceso de obra se alcanzará a generar en promedio 203 empleos formales, de los cuales el 52% son residentes de la comuna 20.

Inversión social complementaria: El Contratista ejecutor de la obra, debe implementar un plan de manejo social (PMS) cuyo objetivo es prevenir, minimizar, mitigar y/o compensar los impactos negativos sobre el entorno socioeconómico del proyecto durante las etapas de construcción y potenciar los efectos positivos que del mismo puedan surgir.



Avance en el mantenimiento de corredores Pretroncales

Metrocali informa que el grupo CONALVIAS -CONSTRUCTORA S.A.S., ejecutó \$614.296.895 en la comuna 20, mediante la rehabilitación de seis (6) tramos viales por donde transitan los buses alimentadores del SITM-MIO.

INTERVENCIONES GRUPO 3 CON CORTE AL ACTA DE OBRA No. 9					
No.	INTERVENCIÓN	TRAMO	COMUNA	CON AUI Y PLANES	LONGITUD EN KM
1	BACHEOS Y PARCHEOS	CALLE 7 Oe ENTRE DG 51 Y CARRERA 52	20	\$ 87.455.719	0,199
2	BACHEOS Y PARCHEOS	DG 51 ENTRE CALLE 10 Oe Y 15 Oe	20	\$ 83.454.782	0,938
3	BACHEOS Y PARCHEOS	CALLE 9 Oe ENTRE CARRERA 52 Y DG 51	20	\$ 35.780.557	0,189
4	REPOSICIÓN DE LOSAS	CALLE 1 ENTRE CARRERAS 55B-56 N-S	20	\$ 43.805.051	0,540
5	REPOSICIÓN DE LOSAS	DG 51 CON CALLE 3 Oe	20	\$ 96.608.308	0,067
6	REPOSICIÓN DE LOSAS	CALLE 1 ENTRE CARRERA 52 Y CARRERA 54 (N-S)	20	\$ 267.192.479	0,413
TOTAL				\$ 614.296.895	2,345

*AUI y Planes es: Administración, Utilidad e Imprevistos y Planes de Gestión Social, Manejo Ambiental y de Transporte.

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre - 2014.



Avance en la Intervención de los puntos de parada del SITM-MIO en la comuna 20

Metrocali informa que se adjudicó a CONALVIAS S.A.S., la adecuación funcional de 17 puntos de parada del Sistema en la Comuna 20, en los cuales se invirtió un total de \$ 91.962.925 distribuidos en las siguientes direcciones:

PUNTOS DE PARADA COMUNA 20					
N°	DIRECCIÓN	BARRIO	MOGADOR	BANCA	ESTADO
1	DG51 CL40 CL50 P	Belisario Caicedo	SI	SI	TERMINADO
2	CL1 KR39A KR40 P 109	Belén	SI	SI	TERMINADO
3	DG51 CL150 CL170 P 136	Cementerio - Carabineros	SI	SI	TERMINADO
4	CL90 KR51A KR52	El Cortijo	SI	SI	TERMINADO
5	CL90 DG50 DG51	El Cortijo	SI	SI	TERMINADO
6	CL90 KR51A KR52	Lleras Camargo	SI	SI	TERMINADO
7	CL1 KR45 KR46 I	Siloé	SI	SI	TERMINADO
8	CL30 DG51 DG50	Siloé	SI	SI	TERMINADO
9	CL70 KR52 KR51A	Siloé	SI	SI	TERMINADO
10	CL1 KR42A KR43A P 146	Siloé	SI	SI	TERMINADO
11	CL1 KR50 DG51 P 104	Siloé	SI	SI	TERMINADO
12	DG51 CL100 CL120	Venezuela - Urbanización Cañaveralejo	SI	SI	TERMINADO
13	DG51 CL120 CL130	Venezuela - Urbanización Cañaveralejo	SI	SI	TERMINADO
14	DG51 KRA52A CL70 P 144	Venezuela - Urbanización Cañaveralejo	SI	SI	TERMINADO
15	DG51 CL170 CL150 P 135	Venezuela - Urbanización Cañaveralejo	SI	SI	TERMINADO
16	DG51 CL140 CL130 P 134	Venezuela - Urbanización Cañaveralejo	SI	SI	TERMINADO
17	DG51 CL100 CL110 P 133	Venezuela - Urbanización Cañaveralejo	SI	SI	TERMINADO

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre de 2014.



Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

INFRAESTRUCTURA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance en las obras de la vía la paz y la vía a Mónaco

2. En la vía La Paz, sector Mónaco - La Estrella: En septiembre de 2014 con una inversión de \$34 millones de recursos propios del 2014, se culminó la construcción de 48mts³ de canaletas en concreto de 40 cms. de ancho x 25 cms. de alto, sobre la vía a la paz, en el sector entre Mónaco y la Estrella.



Antes



En Proceso

A su vez, se construyeron dos pasos vehiculares sobre las canaletas, para prevenir el daño de las mismas, a la altura del predio de Emcali hacia los tanques y en el acceso al Polideportivo La Estrella. Esta pendiente la limpieza de las canaletas existentes y las obras de rocería en el sector.



Después

Vía la Paz hacia el Polideportivo La Estrella- Fuente S.I.V

OBRA	TIPO de OBRA	ORIGEN	CONTRATO No.	CONTRATISTA	VALOR OBRA
Vía La Paz, sector Mónaco - La Estrella	Cunetas	Sobretasa Gasolina	4151.0.26.1.289-14	UNION TEMPORAL VIAS CALI	34.923.652

Fuente: Grupo de Contratación S.I.V

En Estudio y Viabilización :

3. Para la vía La Paz que conduce al Polideportivo La Estrella, bajando por el Arca de Noé, la S.I.V se encuentra realizando los estudios para el mantenimiento de 1.000 mts lineales de vía con recursos propios para el 2015 por \$1.000 Millones.



Informe de obras de bacheo en el 2013 y 2014 en la comuna 20

La Secretaría de Infraestructura y Valorización a través del grupo operativo, ejecutó en julio/2013 y enero/2014 una inversión de \$ 20.690.274 de recursos propios, en el bacheo de siete (7) tramos en el barrio Siloe de la Comuna 20 logrando recuperar un área de 395,19 mts2.

BARRIO	DIRECCION	FECHA	AREA (Mts2)
SILOE	D51 C1W/2W	08-jul-13	147
	D51 1W/2W	08-jul-13	15,18
	D51 C2W/3W	09-jul-13	16,9
	D51 C2W/3W	09-jul-13	196,11
TOTALES:			375, 19

Fuente: Grupo Operativo S.I.V

BARRIO	DIRECCION	FECHA	AREA (Mts2)
SILOE	Calle 1W Cra 49	01-ene-14	1,5
	Calle 1W Cra 39	01-ene-14	0,8
	Calle 1W Cras 65A/56	01-ene-14	22,83
TOTALES			25,13

COMUNA 20		AREA	BACHES	INVERSION
MES	JULIO/2013	375	24	18.759.500
TOTALES		375	24	18.759.500

Fuente: Grupo Operativo S.I.V

COMUNA 20		AREA	BACHES	INVERSION
MES	ENERO/2014	25	10	1.930.774
TOTALES		25	10	1.930.774

Fuente: Grupo Operativo S.I.V



Construyendo hoy
la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

DAGMA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance en mantenimiento de árboles



Mantenimiento Arbóreo

EL DAGMA informa que:

Mantenimiento arbóreo:

- Con un costo de \$616 millones, en Septiembre del 2014 se firmó el acta de inició del contrato de mantenimiento arbóreo para toda la ciudad que se ejecutará hasta el 15 de Diciembre/2014.
- A Junio/2014 se han efectuado 1 poda, y 48 talas. El grupo de mantenimiento arbóreo tiene en sus bases de datos registrados 32 podas y 20 talas prioritizadas que han sido solicitadas por al comunidad, adicionales a las ejecutadas en el 2013.



Avance en mantenimiento de zonas verdes



Mantenimiento Zonas Verdes:

Entre Marzo y Agosto del 2014 se realizaron tres (3) mantenimientos al 100% de zonas verdes y parques de la comuna 20.

El área de intervención correspondió a **96.036 M2** metros cuadrados de zonas verdes localizadas en nueve **(9) Barrios intervenidos:**

Belén, Belisario Caicedo, Cañaveralejo, Pueblo Joven, Siloé, Tierra Blanca, Brisas de Mayo, La Estrella y Urbanización Venezuela.

En Septiembre/2014 se inició el cuarto mantenimiento, en total para la comuna 20 están programados cuatro (4) mantenimientos adicionales.



Construyendo hoy
la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

VIVIENDA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance en titulación de predios

Convenio 006 de 2013:

A Octubre de 2014 se han logrado titular a través de este convenio 20 predios, todos del barrios Lleras Camargo.

La Secretaría informa las gestiones realizadas alrededor de este convenio:



Foto: Asesoría de Participación Ciudadana.

- En Julio/2013, se realizó la socialización del Convenio a los miembros de la JAL en la Comuna 20.
- En Enero/2014, Catastro entregó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en los certificados de plano predial catastral 165 predios posibles de titular en la Comuna 20 distribuidos así:
 1. Lleras Camargo (119),
 2. Pueblo Joven (4)
 3. Siloé (2).
- Entre marzo y septiembre de 2014, se obtuvieron los avalúos de estos predios, se publicaron los edictos y se realizaron las visitas de verificación de ocupación de los lotes a titular.



Avance en titulación de predios

Titulación de los Sectores La Playa y La Cañada: una vez solicitado el concepto de riesgo a Planeación, este informó que estos sectores se encuentran en una zona de protección de la quebrada Guaruz. Por lo anterior, no es viable su titulación.



Foto: Asesoría de Participación Ciudadana.

Titulación Comuna 20:

Entre el 2012 y Octubre de 2014 se han titulado 91 predios, siendo el Barrio Siloe el barrio con más titulaciones (45). En proceso de titulación se encuentran 39 más.

	Barrio	2012	2013	Oct-14	
COMUNA 20	Pueblo Joven	8	7	15	
	Siloé	33	5	7	
	Lleras Camargo	4	4	5	
	Eduardo Santos	2	0	0	
	Belén	1	0	0	
	TOTAL		48	16	27



Avance en Subsidio de mejoramiento de Vivienda Comuna 20

La Secretaría de Vivienda informa:

Con presupuesto de 2014 se han asignado un valor total de aproximadamente \$240 Millones para 46 subsidios de mejoramiento de vivienda en la Comuna 20, previo cumplimiento de los requisitos como lo establece el Acuerdo 049 de 1999.



Subsidios por barrio: Pueblo Joven (33), Lleras Camargo (6), Siloé (5) y Brisas de Mayo (2).

Vigencia	No. Resolución	No. Familias	Observación
2014	Res.253 Abril 23/2014	10	Se iniciaron las obras. El contrato y ejecución termina en Diciembre de 2014.
2014	Res.371 Junio 16/2014	5	Tiene contratista asignado. La ejecución de la obra inicia en Noviembre de 2014.
2014	Res.485 Agosto 13/2014	9	Se encuentra en proceso de licitación. El 10 de Noviembre-2014 se adjudica. Se espera que en este mismo año inicie la obra.
2014	Res.511 Agosto 25/2014	22	Se encuentra en proceso de licitación. El 10 de Noviembre-2014 se adjudica. Se espera que en este mismo año inicie la obra.

Los términos de ejecución son de 120 días, a partir del inicio de la obra.

El subsidio aplica únicamente para barrios desarrollados por la Secretaría de Vivienda y el Fondo Especial de Vivienda, su monto máximo es de \$5 millones, cubriendo hasta agotar recursos las siguientes opciones de obras: Adecuación de cocinas, baños y techos



Construyendo hoy
la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

EMCALI



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Información sobre reposición de redes de acueducto y alcantarillado

EMCALI durante el 2012 y 2013, ejecutó \$ 1.072 Millones de pesos para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, en las siguientes vías y barrios:

Contratos ejecución 2013	Dirección	Barrio	Valor estimado (\$ millones)
2012	Carrera 48 entre Calles 1A y 1Bis	Siloé	\$ 202 (acueducto y alcantarillado)
2012	Calle 23W entre Carreras 49B Bis y 49C	La Sultana	\$ 95 (alcantarillado)
2012	Calle 13B entre Carreras 51 y 52	Lleras Camargo	\$ 135 (alcantarillado)
CO-166-2013	Calle 13 oeste entre cr. 50A y 50B	Lleras Camargo	\$ 237 (acueducto y alcantarillado)
	Calle 1D oeste entre cr. 38C y 38D	Belén	
	Calle 6H oeste entre cl 6G oeste y 7 Oeste	Tierra Blanca	
CO-163-2013	Calle 7 Oeste entre cr 47 y 48	Tierra Blanca	\$ 95 (acueducto y alcantarillado)
	Calle 5B oeste entre cr 40D y 40C	Tierra Blanca	
CO-164-2013	Carrera 39 entre cl. 1 y 1D oeste	Belén	\$ 200 (acueducto y alcantarillado)
	Diagonal 51w entre Cl. 6/9 Oeste	Siloé	\$108 (acueducto y alcantarillado)
TOTAL			\$ 1.072



Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

EDUCACION



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avances de la reconstrucción de la I.E.O Juana Caicedo y Cuero



I.E.O Juana Caicedo y Cuero



Bloque tecnológico, I.E.O Juana Caicedo y Cuero

La Secretaría de Educación informa que :

- El 25 de Septiembre/2013 se firmó el acta de reinicio (contrato 4143.0.26.06), y el contratista Constructora SAINC, para la construcción del Macro proyectó Juana de Caicedo y Cuero.

- **Valor actual de la obra:** \$12.469.355.568

- Especificaciones de la Obra: construcción de edificaciones, redes y conservación así:

- 1 Bloque para el Área administrativa y Biblioteca
- 3 Bloques de 9 aulas de clases
- 1 Bloque para plazoleta y áreas exteriores, pasarela, rampa y baterías sanitarias
- 1 Bloque para planta eléctrica, tanques y motobombas
- Zonas deportivas: 2 canchas múltiples y 1 de sintético futbol 8

- A octubre de 2014 las obras anteriores presentan un avance en construcción de un 100%.

- Esta en proceso de aprobación por parte de Planeación Municipal una adición presupuestal para la construcción y terminación de un edificio tecnológico.

Actualmente la I.E.O Juana Caicedo presenta una capacidad para 1.440 niños en 2 jornadas.



Informe sobre otras obras para la sede principal del Eustaquio y la sede Multipropósito

La Secretaría de Educación informa que se realizó la contratación de las siguientes obras:



I.E.O Eustaquio Palacios



I.E.O Multipropósito

1. **Sede principal - I.E.O Eustaquio Palacios:** Se encuentra en proceso de instalación una segunda malla de cerramiento perimetral a un metro de la existente, para prevenir la venta de estupefacientes a los estudiantes.

- **Inversión:** \$183 millones.

- **Entrega de la obra:** Diciembre de 2014.

- **Avance de la obra:** a octubre/2014 se presenta un avance de obra en construcción de un 75%.

2. **Sede Multipropósito:** Se encuentra en proceso de ejecución la impermeabilización de la loza (techo) para mitigar humedades y filtraciones.

- **Inversión:** \$240 millones.

- **Entrega de obra:** Diciembre de 2014.

- **Avance de la obra:** a octubre/2014 se presenta un avance de obra en construcción de un 90%.



Avances a la implementación de Jornadas Escolares Complementarias

• La Secretaría de Educación informa que el programa «Jornada Escolar Complementaria»:

- Inicio: Agosto de 2014.
- Beneficia: 30 IE de los barrios TIOS.
- Cobija: 14.500 estudiantes de los grados séptimo, octavo y noveno.
- Jornadas de: 9:00 am a 12:00 pm (jornada para los que estudian en la tarde) y 1:00 pm a 4:00 pm (jornada para los que estudian en la mañana).



- El programa incluye 14 alternativas: alimentación (almuerzo), música, salsa, danza moderna, danza clásica ballet, danza folclórica, teatro, teatro expresión libre, teatro callejero - zancos, cine digital, artes plásticas, matemática articulada, semillero de ciencias, emprendimiento y literatura. La estrategia organizativa será a través de clubes juveniles conformados con grupos de 25 estudiantes donde prevalecerá sus interés y habilidades.
- Para esta primera fase en la Comuna 20 fueron priorizadas la siguiente I.E.O:
 - I.E.O Eustaquio Palacios
 - I.E.O Multipropósito



Avances sobre el centro de desarrollo infantil para atención a la primera infancia en la comuna 20



La Secretaría de Educación informó, que para la construcción de un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en La Estrella, obtuvo en Septiembre/2013, una cesión de una parte del lote Polideportivo La Estrella.

- **Ubicación:** Calle 8 Oeste No 42 – 02 Unidad Recreativa La Estrella
- **Área Lote:** 29.104 Mt2
- **Costo Obra:** \$1.522 millones (Recursos incorporados en proyecto de la SEM denominado Nuevas Aulas)
- **Interventoría:** \$76.114.319
- **No. De cupos:** 200 menores de 5 años con atención integral en modalidad institucional.

En Diciembre/2013, mediante licitación, se adjudicó contrato de diseño y construcción de tres (3) C.D.I. (incluido el de Polideportivo La Estrella).

Entrega de Diseños: Pendiente de aprobación por parte de Planeación Municipal, Dagma y la CVC

Estado: Actualmente se encuentra en trámite por parte de la curaduría para la licencia de construcción.



Anuncio Educación Digital para Todos Comuna 20

La Secretaría de Educación informa que para la ejecución del proyecto de educación digital para todos (TIT@) se han contemplado las siguientes etapas:

1. Diagnóstico de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda Ancha): Octubre a Diciembre de 2014
2. Adecuación de la infraestructura de redes eléctricas y de internet (Banda Ancha): 1er Trimestre de 2015.
3. Capacitaciones a docentes y directivos docentes, y pedagogía del proyecto con estudiantes y padres: 2do Trimestre de 2015
4. Entrega de equipos y mobiliarios y operación del proyecto: 3er Trimestre de 2015

En la Comuna 20 se entregarán en el 1er trimestre 2015, un total de 1.330 equipos de cómputo distribuidos así:

1. **I.E Eustaquio Palacios:** Aulas: 17 y 646 Computadores.
2. **Sede Luis López Mesa:** Aulas: 1 y 38 computadores.
3. **I.E Multipropósito:** Aulas: 15 y 570 Computadores.
4. **Sede Jorge Eliecer González:** Aulas: 2 y 76 Computadores.



Anuncio Programa de Alimentación Escolar Comuna 20

La S.E.M. está ejecutando el programa de alimentación escolar en el Municipio de Santiago de Cali, el cual:

- Entrega diariamente **2.731 raciones de alimentación** en dos (2) I.E.O y seis (6) sedes de la **Comuna 20**:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MODALIDAD	RACIONES
I.E. JUANA CAICEDO Y CUERO SEDE SIMÓN BOLÍVAR	PREPARADOS	636
I.E. JUANA CAICEDO Y CUERO SEDE ANTONIA SANTOS	PREPARADOS	105
IE MULTIPROPÓSITO	PREPARADOS	716
SEDE REPUBLICA DE PANAMA	PREPARADOS	359
SEDE SANTA LUISA	PREPARADOS	442
SEDE JORGE ELIECER GONZALES RUBIO	PREPARADOS	337
SEDE LUIS ALBERTO ROSALES	PREPARADOS	136
TOTAL		2.731



Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

SALUD



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance sobre cronograma de construcción de la nueva sede del centro de salud de Siloé (IPS Siglo 21)

A la fecha en su primera etapa se están realizando las siguientes obras de:



1. Instalaciones Sanitarias Urgencias.
2. Instalaciones de Red de Gas Medicinal.
3. Estructurado de Cielos Falsos.
4. Instalación de Bandejas para la red de Datos.
5. Instalación de Ductos para Equipo de Climatización.
6. Instalaciones Sanitarias segundo Piso
7. Fundición de losas en Concreto Rígido para Parqueadero Sótano.
8. Instalaciones Sanitarias y red de Drenaje Sótano.
9. Subestructura de Pavimento.
10. Fundición Muros de Contención Cerramiento Sótanos.
11. Fundición de Muros de Punto fijo para el ascensor y las escaleras.



Imágenes obra IPS Siloé



Información sobre reubicación temporal del personal medico por obras en el Centro de Salud Siloé

La ESE Ladera informa que por las obras del Centro de Salud Siloé se reubicó temporalmente el personal (médicos y enfermeras) así:



IPS	Servicio	No.	Horas Contratadas	Actividades por Hora
PUESTO DE SALUD BRISAS DE MAYO	CONS MED. GRAL	3	8	720
	CONS ENF. PROF	1	8	240
	ATEN. AUX. ENF	3	8	-
PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA	CONS MED. GRAL	2	8	480
	CONS ENF. PROF	1	8	240
	ATEN. AUX. ENF	2	8	-
PUESTO DE SALUD LA SULTANA	CONS MED. GRAL	3	8	720
	CONS ENF. PROF	1	8	240
	ATEN. AUX. ENF	3	8	-
PUESTO DE SALUD SIRENA	CONS MED. GRAL	2	8	480
	CONS ENF. PROF	1	8	240
	ATEN. AUX. ENF	3	8	-
PUESTO DE SALUD BELEN	CONS MED. GRAL	1	8	240
	ATEN. AUX. ENF	1	8	-

Consulta médica general lunes a viernes de 7 a 5 pm



Construyendo hoy
la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

DEPORTE



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance sobre recuperación del Polideportivo la Estrella



Foto de Cancha Sintética Polideportivo La Estrella



Foto Cancha de grama con trabajos de adecuación Polideportivo La Estrella

La Secretaría de Deporte informa que entre el 2012, 2013 y 2014 se ha invertido en el Polideportivo \$503 Millones en obras de adecuación así:

2012 y 2013: se invirtieron **\$233** Millones, de los cuales:

- **\$108 Millones** se utilizaron para obras de adecuación, reparación del muro de cerramiento deteriorado, la reforestación del talud de protección, reparación de la cancha múltiple y el kiosco afectado por la avalancha del 19 de mayo/2013.
- **\$125 Millones** para la adecuación de la cancha sintética. Obra que fue entregada en Julio de 2014 a la comunidad.

Octubre 2014:

Cancha grama: por valor de **\$ \$270 Millones**, se encuentran finalizando las obras de adecuación de la cancha de grama, las cuales incluyeron:

- Adecuación de la tubería de drenaje.
- Nivelación del terreno
- Construcción de pozo para hidratación de la grama.
- Instalación de pantallas retenedoras de balones impidiendo que afecten la parte inferior del Polideportivo.
- Instalación de nueva grama.

Obras complementarias al polideportivo para mitigación del riesgo 2014:

Obra Interna: Optimización del sistema principal de drenaje dentro de la cancha realizado por Emcali.

Obra Externa: la construcción de las canaletas por parte de la Secretaría de Infraestructura Vial.



Otros aportes a juegos deportivos de la comuna 20



La Secretaría de Deporte Informa que:

Entre Septiembre y octubre del 2014, la comuna 20 cumplió una **destacada participación** en los juegos deportivos municipales logrando el 3er. Puesto con 302 puntos y 106 medallas.

Participaron 220 deportistas de la comuna 20 en las disciplinas de:

- Levantamiento de pesas.
- Lucha
- Judo
- Taekwondo
- Fútbol
- Tenis de Mesa
- Esgrima
- Hapkido
- Tejo
- Billar



Construyendo hoy
la **Cali** del mañana

ALCALDÍA DE CALI

CULTURA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance sobre ejecución situado fiscal 2012 y 2013

La Secretaría de Cultura informa que se ejecutaron en el 2013:

\$216 millones correspondientes a recursos de situado fiscal vigencia 2012 y \$288 millones de la vigencia 2013.

VIGENCIA	PROYECTO	CONTRATISTA	VALOR
2013	Apoyo a eventos culturales de la Comuna 20	IPC	\$228,000,000
2013	Apoyo a eventos culturales para discapacitados en la comuna 20.	Fundación Promoción y Gestión Social	\$60,000,000
2012	Mejoramiento de Eventos Culturales B.P 34611	IPC	\$136,558,400
2012	Creación y Dotación biblioteca barrio el Cortijo	Asociación Cristiana De Jóvenes- ACJ-	\$40,000,000
2012	Mejoramiento de Eventos Culturales población en discapacidad	TALENTUM	\$40,000,000



Avance sobre dotación a bibliotecas comunitarias

La Secretaría de Cultura informa que:



- Se invirtieron \$70 millones para la Bibliotecas de Tierra Blanca y el Centro Cultural con recursos de situado fiscal vigencia 2013, para la compra de insumos; adscritas a la Red de Bibliotecas de la comuna 20.
- La dotación se encuentra en el almacén de la Secretaría desde Diciembre de 2013 y se espera que las organizaciones cumplan con la requisitos necesarios (dentro de los cuales se encuentra estar formalmente constituidos), para hacer la entrega de los insumos bajo la figura de comodato.



Construyendo hoy
la Cali del mañana

ALCALDÍA DE CALI

GOBIERNO



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Avance en iluminación con luz blanca de espacios públicos en la comuna 20

La **Secretaría de Gobierno** iluminó con luz blanca cinco (5) parques de la comuna 20:



Dirección		Barrio	Inversión
C 1 OES / K 54	20	BELISARIO CAICEDO	\$26.930.853
CRA 52 CL 2	20	SILOE	\$11.397.303
CRA 47 CL 1 Y 1D	20	SILOE	\$7.714.748
CRA 42 OESTE # 8-02	20	SILOE	\$75.874.045
CRA 42 OESTE CON CALLE 9	20	SILOE	\$30.736.189
Total Inversión Comuna 20			\$152.653.138

La iluminación de los 2 parques restantes, (pueblo joven y carrera 55 con calle 1, el Lido) están priorizados para ejecutarse en 2014.

La ejecución de la obra se complementa con acciones con los grupos juveniles para el buen manejo de las zonas verdes y los espacios deportivos, acompañados de acciones en seguridad por parte del cuadrante del sector.



Avance en la instalación de cámaras de seguridad



La Secretaría de Gobierno Convivencia y seguridad informa que:

- En 2013 con una inversión de \$ 255.818.181,82, Instaló seis (6) cámaras de seguridad pertenecientes al proyecto 160 Cámaras en convenio con FONSECON.
- En el 2014 Con una inversión de \$ 150.000.000,00 se instalaran 3 cámaras mas pertenecientes al proyecto de 40 cámaras gestionado por la SGCS.
- En el segundo semestre de 2015 con una inversión de \$ 80.000.000,00 se instalaran dos cámaras adicionales pertenecientes al proyecto de 200 cámaras convenio con FONSECON.
- En abril de 2014 se firmo el contrato de mantenimiento de cámaras de seguridad \$ 650.000.000, con la cual la comuna contara con un circuito de video vigilancia equipado con 11 Cámaras de video Vigilancia Funcionando.

Localización (160) Cámaras Ubicadas por Barrio Inst. en 2013

No	Barrio	Dirección	No	Barrio	Dirección
1	CL 7 OE DG. 50	EL CORTIJO	4	CL 6 OE DG 51	CEMENTERIO SILOE
2	DG 51 CL 3 OE	SILOE	5	DIAG. 51 Oe con 14	CEMENTERIO JARDINES DE LA AURORA
3	CL 1 OE CR 48	SILOE P/LA ORQUETA	6	CL. 4 OE DG. 51	SILOE

INST. 40 CAMARAS COMPROMISO SGCS

1	CARRERA 46 CALLE 3 OESTE	SILOE	3	CARRERA 47 CALLE 3 OESTE	SILOE
2	CARRERA 51C CALLE 10 OESTE	LLERAS CAMARGO			

INST. 200 CAMARAS CONVENIO FONSECON 2014

1	CL 1 OES CR 42 *	SILOE	2	Calle 7B Oeste N° 48A - 29 - Sede Comunal	TIERRA BLANCA
---	------------------	-------	---	---	---------------



Avance en intervención social con jóvenes



Fuente Caliescibe.com

Actividades Básicas del Proyecto

- Intervención con jóvenes entre los 8 y 26 años.
- Asesoría con enfoque psicosocial.
- Promoción de proyectos de vida y justicia reparatoria.
- Gestión de iniciativas productivas.
- Arte y deporte para la vida.

La Secretaria de Gobierno Informa que:

Intervención social 2013: inversión de \$1.000 Millones en El proyecto de colectivos que beneficio a 300 jóvenes de las comunas 18, 20 y a 400 mas de las comunas 13, 14 y 6.

Intervención Social 2014: Para noviembre de 2014 se dará inicio a la segunda etapa del colectivo que beneficiará a 300 jóvenes más de la Comuna 20 y 18, con una inversión total de \$2.187 Millones.

Proyecto Colectivos Santiago de Cali 2012-2014			
Comunas	2012	2013	2014
13 y 14	400	300	350
16	0	0	150
18 y 20	0	300	300
6	0	100	150
21	0	0	200
15	0	0	100
3	0	0	150
Total Jóvenes Beneficiados	400	700	1400
Presupuesto	\$500 Millones	\$1.000 Millones	\$ 2.187 Millones

El Colectivo interviene NNAJ entre 8 y 26 años en situación de vulnerabilidad social expuestos a riesgos de pandillas, bandas, consumo de sustancias psicoactivas y desvinculación del sistema educativo.

